

南京市江宁区农村公路高质量提档升级工程 五年实施方案（2021-2025 年）

南京市江宁区交通运输局
中设设计集团股份有限公司
二〇二〇年八月

目 录

一、发展背景	1
(一) 现实基础	1
(二) 发展要求	3
二、总体思路	5
(一) 指导思想	5
(二) 实施原则	6
(三) 建设目标	7
三、任务要求	8
(一) 建设任务	8
1.提档升级项目	8
2.大、中修项目	10
3.农路养护项目	11
4.旅游道路项目	13
5.危桥改造项目	20
6.配套设施项目	21
7.项目汇总	27
(二) 技术标准	30
(三) 政策原则	30
四、保障措施	32
(一) 加强组织领导	32

（二）加强技术指导	32
（三）强化资金保障	32
（四）深入宣传发动	33
（五）严格督查考核	33
附表 1 南京市江宁区县道网提档升级工程实施序列表.....	35
附表 2 南京市江宁区乡村道提档升级工程实施序列表.....	38
附表 3 南京市江宁区县道网大中修工程实施序列表.....	56
附表 4 南京市江宁区农村旅游道路工程实施序列表.....	59
附表 5 南京市江宁区县道危桥改造工程实施序列表.....	61
附表 6 南京市江宁区乡村道危桥改造工程实施序列表.....	63

农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。为全面落实好习近平总书记对农村公路的重要指示精神，贯彻交通运输部、省交通运输厅关于推进“四好农村路”建设的意见以及省、市、区政府关于“四好农村公路”高质量发展的文件精神，加快农村公路从规模速度型向质量效益型转变，进一步方便广大群众安全便捷出行，促进农村公路与现代农业、田园综合体、特色小镇融合发展，助力国家全域旅游示范区建设、农村人居环境整治、紫东片区发展和美丽乡村建设，支撑江宁社会主义现代化试点建设，结合农村公路发展实际，我局制定了《南京市江宁区农村公路高质量提档升级工程五年实施方案（2021-2025 年）》。

一、发展背景

（一）现实基础

1.发展成就

“四好农村路”是习近平总书记亲自提出、亲自推动的一项民生工程、民心工程、德政工程。党的十八大以来，习近平总书记高度重视“四好农村路”发展，先后多次作出重要指示，为农村公路发展提供了根本遵循和行动指南。江宁区作为 2018 年交通运输部、农业农村部、国务院扶贫办联合命名的“四好农村路”全国示范县之一，始终把“四好农村路”建设作为实践乡村振兴战略、服务农业农村现代化的重要抓手，取得了突出成绩，农村路网结构不断完善，质量水平不断提高，产生了良好的经济和社会效益。“宁径织美”获全省第一批农村公路“一县一品牌、一区一特色”品牌（苏交公路[2019]17 号）。

自 2013 年开始，根据省政府关于实施农村公路提档升级工程的统一部署，江宁区即启动了农村公路提档升级工作，并于 2014 年印发了《关于加快推进农村公路提档升级工程的实施意见》（江宁政发〔2014〕259 号）中提出，从 2015 年起用 4 年时间完成全区 502 公里农村公路提档升级工程建设任务。《南京市江宁区 2018-2020 年农村公路提档升级工程实施方案》中提出从 2018 年起，用 3 年时间完成约 592 公里农村公路提档升级任务。

预计到今年年底，江宁区累计投入约 40 亿元，提档升级约 1200 公里农村公路，探索实践了“农村公路+特色产业”等富民新模式，先后建成联一线、联二线、朱石线、正东线等一批美丽农村路，建成 130 公里西部美丽乡村线和 80 公里休闲健身道，串联起 316 个特色田园乡村，织造出江宁农村的幸福生活路、乡村振兴路，实现农村公路与农村产业基地、旅游景区、田园综合体、乡村旅游等产业项目组合开发。

2019 年底全区农村公路通车总里程 1995 公里，其中县道 455 公里，乡道 906 公里，村道 634 公里，县道三级及以上公路占比达到 94.3%，行政村双车道四级及以上公路覆盖率达到 100%。通过近 8 年的努力，全区农村公路通达水平和技术等级明显提升，有力地促进了农村地区经济社会发展，得到了农村群众的普遍拥护和社会各界的广泛赞誉，为全区率先实现小康目标作出了重要贡献。

表 1 2019 年农村公路道路等级一览表

分类	里程 (公里)	比例 (%)
合计	1995.004	100
一级	247.271	12.39
二级	87.588	4.39
三级	394.049	19.75
四级	1266.096	63.46

2.存在问题

江宁区农村公路建设虽然取得了较好的成绩，但对照当前高质量发展 and 现代化试点建设的新要求和高标准，仍存在一些不足。**一是农村公路成网成环建设水平有待提升。**考虑高速、国省道等干线的新建和改线，以及江宁区村庄布点调整等背景，农村公路与干线公路之间以及农村公路内部成网成环的建设水平有待提升。**二是农村公路技术等级仍有待提升。**目前还存在部分不达标线路，县道仍有 26 公里未达到三级道路标准，乡村道仍有约 376 公里需要提档升级。**三是“农村公路+”融合发展水平有待提升。**为服务全域旅游示范区和美丽乡村建设，在现状 130 公里旅游乡村路建设基础上，仍有 116 公里乡村旅游道路需加快实施。能够切实提升农村公路服务水平的指路标志和驿站等综合服务设施有待进一步落实。**四是农村公路交通安全保障水平有待提升。**农村公路危桥仍没有完全消除，生命安全防护工程需要持续常态维护。

(二) 发展要求

1.实施乡村振兴战略要求农村公路发挥先行引导作用

实施乡村振兴战略，是党中央作出的重大战略部署，是新时

代“三农”工作的总抓手。江宁作为城镇化进程较快、农业农村发展基础较好的地区，有基础、也有责任加快走出一条符合中央要求、契合江宁实际、顺应群众期盼的乡村振兴新路子。农村公路是实施“乡村振兴”发展战略的有力抓手，是以“小工程”形式体现的“大民生”，在培育小城镇、推进农业现代化、改善农村人居环境、加快基本公共服务均等化等方面的基础性和服务性作用突出，是连接城市和农村的重要纽带。下阶段江宁区要重点结合村庄布局调整，打通跨村跨乡跨县的断头路，继续加快推进路网提档升级，实现农村公路“联城、联乡、联村、联景、联心”。

2.助推社会主义现代化试点建设要求持续推进农村公路品牌建设

2019年5月，江苏省省委省政府确定要在江宁区等六个区县开展社会主义现代化建设试点，要求通过两年左右的努力，在探索社会主义现代化建设的主要内涵和指标设置上取得重要成果，形成可复制可推广的实践经验。下阶段江宁区应牢牢把握发展机遇，继续扎实推进“四好农村路”品牌打造，打造“四美”宁径，创新发展理念，高质量推动农村公路建设。全面推行品质工程建设，以淳马线为示范，加强工程质量管控，在继承先进施工经验的基础上，适时推广运用新技术、新工艺、新材料，切实提升工程品质，打造一流示范作品。

3.支撑国家全域旅游示范区建设要求切实提升农村公路服务品质

作为首批国家全域旅游示范区创建单位，近年来江宁区全域

旅游发展迅速，建成黄龙岷等近 20 个中国最美乡村、1 个国家部委田园综合体试点、5 个江苏特色田园乡村试点、33 个省高星级乡村旅游示范区、116 个南京市级美丽乡村示范村，美丽乡村覆盖率达 76%。农村公路是支撑旅游产业发展的“先行者”，下阶段要重点结合旅游资源的“聚宝盆”，精准聚焦“线”成“网”、“窄”变“宽”、“通”向“好”的“四好农村路”建设，充分结合特色旅游资源，将农村公路建设与周边旅游景区、美丽乡村等融合设计，打造江宁代表乡韵美径，实现“路即是景”的目标，助力全域旅游发展步入“快车道”。

4.构建现代综合交通运输体系要求畅通农村公路微循环

农村公路是综合交通运输体系中的“毛细血管”，是拓展轨道、水运、航空等干线交通服务范围和服务深度的基础，其畅通与否将直接影响各类交通基础设施的全面对接、顺畅衔接。江宁区分省干线四通八达，在打通“主动脉”的同时，更要畅通涉及千家万户的“毛细血管”，打通“最后一公里”，形成微循环网络，充分发挥路网整体运行效率和综合交通组合效益。畅通农村公路微循环，实现与上层路网的紧密顺畅衔接，是构建现代综合交通运输体系的迫切需要。

二、总体思路

（一）指导思想

深入贯彻落实习近平总书记对农村公路的重要指示精神，认真落实省委十三届三次、四次、五次、六次全会决策部署，贯彻交通运输部、省交通运输厅关于推进“四好农村路”建设的意见以及省、市、区政府关于实施农村公路提档升级工程的文件精神，

按照《多部门¹关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见（交公路发〔2019〕96号）》、《江苏省农村公路条例》等文件要求，以服务农村经济社会发展和方便广大群众安全便捷出行为目标，以满足全域旅游示范区、美丽乡村、农业现代化等建设需求为导向，兼顾村庄布点规划调整等要求，以农村公路成网成环、提档升级、专业养护、旅游道路、危桥改造和配套服务设施建设等为重点，因地制宜、量力而为，统筹安排农村公路高质量提档升级项目，进一步提升农村公路的通畅水平、安全条件、路域环境和服务质量，促进城乡融合发展，为江宁区实施乡村振兴战略和建设社会主义现代化试点提供坚实的农村交通运输保障。

（二）实施原则

“利出行”：农村公路的规划、设计和建设需与城镇体系规划、特色田园乡村建设、产业布局规划、美丽乡村规划、民俗示范村建设等相结合，推进农村公路成网成环，便捷农民群众出行。

“疏节点”：实现农村公路对所有城乡节点、新型社区等行政类节点，农业产业园、工业集中区、乡村旅游点、农村物流点等经济类节点全覆盖。

“保安全”：安全是农路建设的首要前提，提档升级工作需同步注重农路安防工程的实施，同时将农村公路安防设施项目列入常态化养护项目，利用信息化的安全监管手段，确保农村公路的运行安全。

“补短板”：进一步优化完善农村公路交通网络，加强对“瓶颈路、问题路、隐患路”的综合提升改造工作，为农村公路的高

¹ 交通运输部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、农业农村部、国务院扶贫办、国家邮政局、中华全国供销合作总社

质量发展扫清障碍。

“强养护”：转变“重建轻养”的传统观念，深化农村公路养护市场化改革，探索推行养护“路长”制，将农村公路养护机械化、专业化、智慧化纳入政府考核体系，有效提升养护先进水平。

“优管理”：树立“技术比人可靠”的管理理念，利用道路感知、安全监测、事故预警等信息化技术，加强农村公路的运营管理，提升综合管理效率。

“提质量”：江宁“四好农路”建设已走向纵深，下一步应注重农村公路的高质量发展，实现从“走得通”到“走得好”的转变。

“美环境”：突出农村公路“由线到带”的建设思路，加强沿线环境综合整治，将农村公路打造成旅游风景走廊，实现交通基础设施由单一运输功能向运输、生态、旅游等复合功能的转变。

“分步骤”：农村公路建设工程资金投入较大，考虑区财政的资金压力，合理制定农村公路提档升级计划，分步骤、分时序的推进相关建设工作。

（三）建设目标

到 2025 年，完成农村公路提档升级约 402.5 公里，大中修工程 557 公里，旅游道路建设 116 公里，危桥改造 139 座，配套实施生命安全防护工程、指路标志、驿站等服务设施，实现农村公路成网成环，建成网络畅、品质高、服务优、路域美的农村公路网络，实现“四个更加”和“四个百分百”目标。即双车道通自然村覆盖率 100%，规划节点（包括乡村旅游景点、农村物流节点、

规划居民保留点等)覆盖率 100%，规划县、乡道网达标率 100%，危桥处置率 100%和养护机械化率 100%。确保农村公路通行更加顺畅、服务更加广泛、运营更加安全、环境更加优美。

一是通行更加顺畅：提高城乡、镇村道路通行能力。实现城区与街道、街道间通达三级及以上技术标准公路；街道与行政村及行政村间通达双车道四级及以上技术标准公路。

二是服务更加广泛：延伸农村公路服务范围。实现城乡节点、新型社区等行政类节点，农业产业园、工业集中区、乡村旅游点（特色田园乡村、美丽乡村、民宿示范村等）、农村物流点等经济类节点，高速公路互通、港口作业区等交通类节点双车道四级及以上公路全覆盖，与路网形成较好连接，实现农村公路成网成环。

三是运营更加安全：打造“放心路、放心桥、放心车保安全工程”。基本消灭农村公路安全隐患，持续推进农村公路生命安全防护工程。全面消除农村公路危桥。农村公路工程质量耐久性、抗灾能力得到显著增强，安全保障水平进一步提升，群众安全感、获得感、幸福感进一步增强。

四是环境更加优美：农村公路沿线的绿化水平得到显著提升，沿线服务设施更加完善，旅游道路建设更加友好，更具田园风光、山水风韵、乡土风情，有效策应全域美丽乡村和全国生态文明示范区建设。

三、任务要求

（一）建设任务

1.提档升级项目

2020年3月3日，江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过的《江苏省农村公路条例》（自2020年6月1日起施行），其中第十六条明确提出农村公路县道的建设不得低于三级公路技术标准，乡道、村道的建设不得低于四级公路技术标准。江宁区也结合自身实际情况，2019年5月印发了《南京市江宁区国省干线养护和“四好农村路”建设及资金管理检查考核办法》，其中明确要求一般双车道四级公路路面宽度不小于6米，受限路段不小于5.5米。

根据上述要求，对江宁区现状未达标农村公路进行全面梳理，结合村庄布局调整规划及紫东地区一体化、宁博一体化发展需求，未来五年，计划完成约402.5公里农村公路提档升级任务，打通农村公路“微循环”，支撑区域一体化发展。其中，县道提档升级项目26.2公里（见附表1），乡村道提档升级项目376.3公里（见附表2），总投资约21.52亿元。

2021年，完成农村公路提档升级规模54.4公里。其中，县道提档升级5.3公里，乡村道提档升级49.1公里，总投资2.92亿元。

2022年，完成农村公路提档升级规模92.2公里。其中，县道提档升级4.9公里，乡村道提档升级87.3公里，总投资4.92亿元。

2023年，完成农村公路提档升级规模91.5公里。其中，县道提档升级2.8公里，乡村道提档升级88.7公里，总投资4.87亿元。

2024年，完成农村公路提档升级规模94.1公里。其中，县

道提档升级 6.4 公里，乡村道提档升级 87.7 公里，总投资 5.03 亿元。

2025 年，完成农村公路提档升级规模 70.4 公里。其中，县道提档升级 6.8 公里，乡村道提档升级 63.6 公里，总投资 3.78 亿元。

2.大、中修项目

根据《市政府关于高质量推进“四好农村路”建设的实施意见（宁政发[2018]148 号）》和《南京市江宁区关于高质量推进国省干线管养和“四好农村路”建设的实施意见（江宁政发[2018]369 号）》文件要求，县道大中修工程年度里程达到养护里程的 8%，乡、村道大中修工程年度里程达到养护里程的 5%。为保证县、乡、村道大中修工程项目的科学性和合理性，结合现状大中修需求调研情况，我区提出严格遵循《农村公路养护管理办法》（交通运输部令 2015 年第 22 号）文件中要求的“县级交通运输主管部门和公路管理机构定期组织开展农村公路技术状况评定”，并据此制定年度大中修项目，原则上按照县道每年不少于养护里程 8%，乡村道不少于养护里程 5%的标准安排实施。各街道乡村道大中修年度养护里程详见下表 2。

综上，未来五年计划完成约 557 公里农村公路大中修任务，其中县道大中修项目 172 公里（见附表 3），乡村道大中修项目 385 公里，总投资约 15.4 亿元。大中修项目纳入提档升级项目政策统一管理。

2021 年完成农村公路大中修项目 111.8 公里。其中，县道大中修 34.8 公里，乡村道大中修 77 公里，总投资 3.1 亿元。

2022 年完成农村公路大中修项目 103.8 公里。其中，县道大中修 26.8 公里，乡村道大中修 77 公里，总投资 2.7 亿元。

2023 年完成农村公路大中修项目 103.7 公里。其中，县道大中修 26.7 公里，乡村道大中修 77 公里，总投资 2.7 亿元。

2024 年完成农村公路大中修项目 114.8 公里。其中，县道大中修 37.8 公里，乡村道大中修 77 公里，总投资 3.2 亿元。

2025 年完成农村公路大中修项目 122.6 公里。其中，县道大中修 45.6 公里，乡村道大中修 77 公里，总投资 3.6 亿元。

表 2 各街道乡村道大中修年度养护里程

街道名称	年度里程 (km)	养护里程 (km)	占比 (%)
淳化街道	9	174	5%
东山街道	5	105	
谷里街道	5	107	
横溪街道	14	272	
湖熟街道	8	160	
江宁街道	13	259	
禄口街道	5	101	
秣陵街道	8	169	
麒麟街道	3	62	
汤山街道	7	132	
合计	77	1540	

3.农路养护项目

根据《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111—2019)和《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190—2019)、《南京市江宁区关于高质量推进国省干线管养和“四好农村路”建设的实施意见(江宁政发[2018]369号)》以及《江苏省农村公路条例》

精神，按照防治结合、全面养护、保障畅通的要求，扎实有序开展农村公路养护管理工作。

贯彻落实国办深化农村公路管养体制改革的意见，推进农村公路管养体制改革，研究并形成以公共财政投入为主、多渠道筹措为辅的资金保障机制，保证农村公路管养资金充足。

全面实施农村公路养护市场化改革，建立以农村公路养护质量和安全为主的信用体系。

实行养护“路长”制，建立区级、主管部门、街道、村（社区）四级²路长管理制度，落实管养责任。实现公路、公路用地及公路建筑控制区内无违法广告、无违法建筑物和地面构筑物、无违法搭接道口和占用挖掘公路、无违法跨越和穿越公路的物体、无违法非公路标志、无固定占道停车卸货、无马路市场和打谷晒场、公路用地范围内无堆积物等路域环境“八个无”。

提升养护机械化、专业化水平，成立专业化农村公路养护队伍，完成一个一类、四个二类县道养护工区建设，与干线工区形成互补互助，全面提升江宁区农村公路养护水平和效率。配套建设 4 处农村道路垃圾中转站，采用运输车的方式进行短距离运输，加强工业机器人应用，着力实现智能化的垃圾分类。以县道为试点，开发推广公路养护智能检测系统，实现对农村公路养护的智能化巡查、机械作业的全面掌握、审批执法的定位跟踪、道路数据的动态管理等，努力提升养护质量和资金使用效益。

² 四级路长制：总路长由区政府主要领导担任，副总路长由分管区长担任，县道路长由区级交通主管部门主要负责人担任，乡、村道路长由属地街道、村（社区）主要负责人担任。

加快推进在重要县道路段设置流动治超点和不停车检测点，并结合乡村道的实际情况，在部分乡道、村道的出入口设置必要的限高、限宽设施，实现治超工作动态与静态相结合，营造农村公路良好的通行环境。

4.旅游道路项目

2019 年交通运输部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、农业农村部等部门联合发布《关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见（交公路发[2019]96 号）》，推进“农村公路+产业”融合发展，与旅游发展规划有效衔接，鼓励将农村公路与乡村旅游一体化开发，到 2025 年，有需求的地区实现乡乡都有产业路或旅游路。江苏省在 2018 年发布的《省政府关于进一步加强“四好农村路”建设的实施意见（苏政发[2018]66 号）》中提出，要积极探索实施农村公路“+乡村旅游”新模式，因地制宜建设旅游路，开发一批精品自驾游和旅游公路示范线，打造江苏旅游公路的特色品牌。江宁近年来努力打造美丽乡村，大力发展乡村旅游，并于 2019 年入围了首批国家全域旅游示范区。一系列上位文件要求和全域旅游的发展对江宁农村旅游道路的建设提出了更高要求。

因此，结合江宁区全域旅游规划及东、中、西美丽乡村规划等，布局形成“旅游九环”，形成全域旅游“微循环”，覆盖特色田园乡村四大片区二十个组团。未来五年计划实施约 115.7 公里旅游道路建设任务（见附表 4），其中县道旅游道路 15.8 公里，乡村道旅游道路 99.9 公里，计划完成总投资 5.3 亿元。

2021 年，完成汤山旅游连接线道路建设，总规模约 32.6 公里，总投资约 0.84 亿元。

2022 年，完成汤泉度假康养环和地矿奇观探险环建设，总规模约 14.1 公里。其中，县道项目 9.2 公里，乡村道项目 4.9 公里，总投资 0.71 亿元。

2023 年，完成江南田园文化旅游环的建设，总规模约 26.8 公里。其中，县道项目 5 公里，乡村道项目 21.8 公里，总投资 1.53 亿元。

2024 年，完成都市农业示范环和西部生态度假环的建设，总规模约 18.5 公里。其中，县道项目 1.6 公里，乡村道项目 16.9 公里，总投资 1.065 亿元。

2025 年，完成红色记忆寻踪环和溪田森林氧吧健身环的建设，总规模约 23.7 公里，均为乡村道项目，总投资 1.14 亿元。

专栏：“九环”农村旅游公路

结合江宁区东、中、西三大旅游片区规划，打造“九环”农村旅游公路，总里程约 274 公里。九环之间利用国省干线进行串联，环环相扣，实现景区之间“微循环”，特色田园乡村各大片区共二十个组团全覆盖。

(1) 青龙山运动休闲环：X002-龙尚路-S002-G104-神风路。位于东部旅游片区，沿线串联梨花谷、青龙山庄、足球训练基地、余村水库、横山水库、草莓园、七坊等利用 S002 和 G104 串成环，主要功能为运动休闲，采用“旅游+道路”模式，充分利用自然资源，打造沿山风景路。本环的道路硬件基本完善，部分路段纳入大中修计划。此外需适当增加沿路停车设施，方便游人停驻。

联阳山碑材、汤家家、紫清湖扬子鳄生态基地、园博园等代表性景区。本环中 X002 路段部分在修，另有部分路况难以满足旅游道路高品质要求，需进行建设完善的道路长度约 8.1km。




地矿奇观探险环

(4) 都市农业示范环：汤铜公路-青赤路-Y287-Y305-Y209-X201-Y283-马场山路-G104。位于中部旅游片区东部，串联了水印土桥休闲区、马场生态旅游区、湖熟现代农业旅游区。利用现状低等级公路进行提档升级，按照旅游景观通道标准进行修建。本环中，除青赤路外，其余道路路面均需要重新铺装，长度约 11.4km，并需要在适当位置设置停车、观景台等配套设施。




都市农业示范环

(5) 江南田园文化旅游环：该片区水网发达，建议新建若干条农村公路实现景区之间的串联，带动钱家渡和孙家桥两个江南水乡村，以及尚桥生态园、现代农业展示馆、湖熟菊花园、渔趣园等多个旅游资源的组合发展；结合规划中秦淮河和句容河旅游航道，规划新建沿秦淮河和句容河的绿道，实现旅游航线与农村旅游公路的顺畅衔接。本环中，为畅通路网需要新建的道路总里程约为 26.8km。

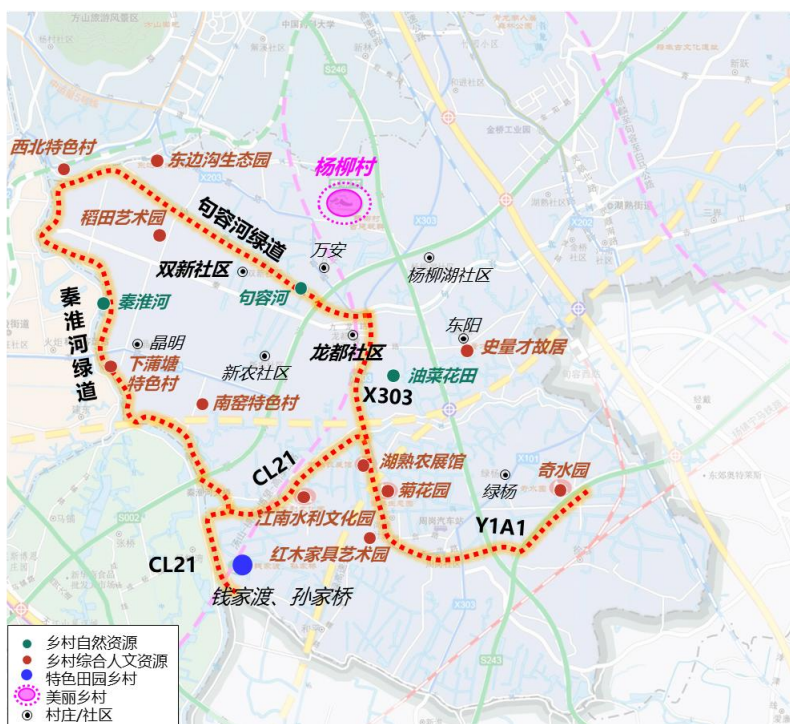

江南田园文化旅游环

(6) 红色记忆寻踪环：S340-Y013-Y367-X306-X103。位于中部旅游片区，整合蟠龙湖水库及横山自然资源，挖掘大呈村、上庄村等红色旅游资源，打造精品路线。本环中，Y013-Y367 路段路面质量一般，需要进行修缮的道路长度约 13.4km。

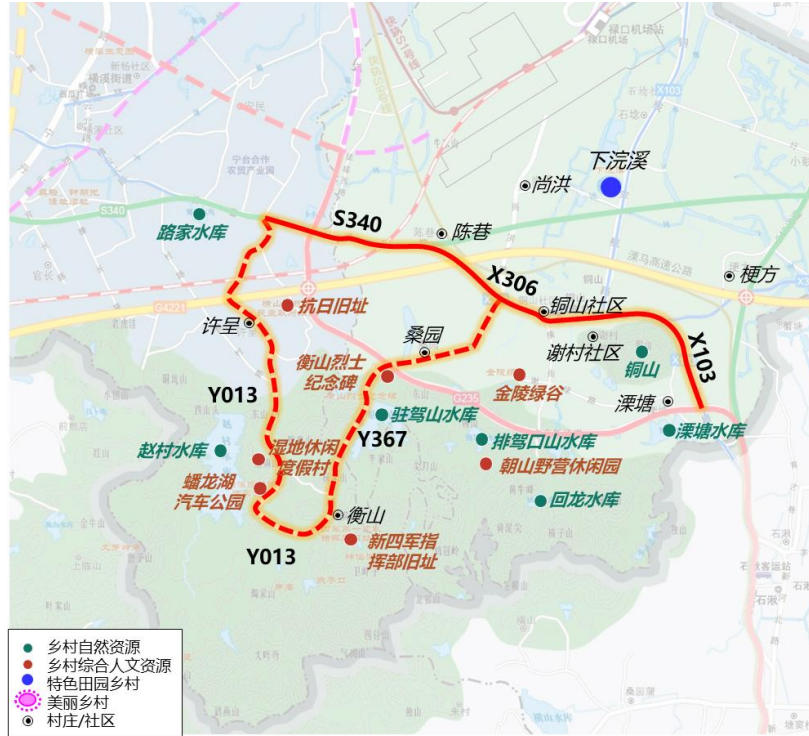

红色记忆寻踪环

(7) 牛首文化旅游环：大周路-将军大道-宁丹路-正方大道-牛首大道，位于西部旅游片区，沿线串联牛首胜境、南唐二陵、世凹特色村、郑和墓、樱花园等景点。本环的道路设施基本完善，为持续维持农村旅游道路高质量服务要求，需要进行常态化大中修。

氧吧，还能体验现代田园综合体的风貌。本环中，路面需要修缮的路段总里程约 10.3km。



溪田森林氧吧健身环

5.危桥改造项目

《多部门关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见(交公路发〔2019〕96号)》中，明确提出要加快实施“放心路、放心桥、放心车保安全工程”，加强桥梁管理和重点桥梁定期检测，落实桥梁养管“十项制度”，加大危桥改造力度，实现危桥总数逐年下降。《江苏省农村公路条例》第四十一条提出，县(市、区)人民政府应当组织有关部门、乡镇人民政府对经检测评定达不到安全技术要求的农村公路桥梁和隧道，及时采取限载、限行、禁行等措施，设置警示、绕行标志，并组织维修和加固、改建或者拆除重建。

经调研，我区现有农村公路桥梁 350 座，其中 70%左右均建成于 2010 年前，由于早期技术条件约束、设计交通量较小、安防意识不强等原因，部分桥梁存在宽路窄桥、桥面破损严重、安

全防护设施不完善等问题。而目前由于我区农村公路整体质量较优，吸引部分重载交通流，进一步加剧了桥面破损情况。且部分危桥坐落于镇村公交、校车线路上，给公众出行带来了一定的安全隐患。因此，为深入贯彻落实上级要求，营造安全的镇村公交和校车运行环境，提高农村公路整体安全水平，我区对现状桥梁进行了系统摸排梳理，计划 2020 年至 2022 年的 3 年时间，完成 139 座危桥改造项目，总投资 2.99 亿元。其中，2020 年实施 42 座，投资 0.721 亿元；2021-2022 年还需要完成 97 座（见附表 5、6），投资 2.269 亿元。

2020 年已经完成 42 座危桥改造项目，其中县道危桥改造 12 座，乡村道危桥改造 30 座，总投资 0.721 亿元。

2021 年完成 56 座危桥改造项目，其中县道危桥改造 16 座，乡村道危桥改造 40 座，总投资约 1.511 亿元。

2022 年完成 41 座危桥改造项目，其中县道危桥改造 4 座，乡村道危桥改造 37 座，总投资约 0.758 亿元。

6.配套设施项目

（1）指路标志

农村公路是整个路网的“毛细血管”，具有密度大、线路复杂、交叉路口多等特点，随着江宁区城镇化水平逐年提高、美丽乡村发展如火如荼，行驶于农村公路上的外地车辆越来越多，而现有的一些农村公路指路标志，在合理性、科学性、规范性方面与国道存在着较大差距，严重影响了农村公路路网整体效益的发挥。因此，我区于 2019 年开展了农村公路指路标志需求调研，

并已探索实施了 13 条县道指路标志项目，实现了县道与国省干道指路系统的有效衔接，提升了公众的出行体验，取得了广泛好评。因此，计划于未来五年完成剩余县道（见下表 3）及部分重要乡村道（见下表 4）的指路标志建设，总投资约 1.28 亿元，其中县道 268 万元，乡村道 1.252 亿元。

未来五年，计划完成所有县道与乡村道交叉口指路标志的设置，总投资约 1.3 亿元。

2021 年，完成 7 条县道指路标志设置，完成 313 个乡村道交叉口的指路标志设置，总投资 2772 万元。

2022 年，完成 313 个乡村道交叉口的指路标志设置，总投资 2504 万元。

2023 年，完成 313 个乡村道交叉口的指路标志设置，总投资 2504 万元。

2024 年，完成 313 个乡村道交叉口的指路标志设置，总投资 2504 万元。

2025 年，完成 313 个乡村道交叉口的指路标志设置，总投资 2504 万元。

表 3 县道指路标志项目

序号	县道	起点	止点	里程 (km)	数量 (个)
1	X001	袁家边	共青团路	28.8	19
2	X101	湖熟	地溪桥	8.76	20
3	X103	宁高线	溧塘	13.84	29
4	X203	江宁高级中学	龙都大桥	11.2	3
5	X206	江宁雨花界	陆郎客运站	17.68	36
6	X207	正方大道	安徽霍里街道	20.1	33

序号	县道	起点	止点	里程 (km)	数量 (个)
7	X301	华侨公墓	麒麟街道	2.95	11
指路标志合计				103.33	151

表 4 乡村道每年度指路标志项目

序号	部门	实施项目	总里程 (km)	交叉口个数 (个)	建设预算(万元)
1	淳化街道	乡村道	173.78	35	280
2	东山街道	乡村道	105.41	22	176
3	谷里街道	乡村道	107.11	22	176
4	横溪街道	乡村道	271.74	55	440
5	湖熟街道	乡村道	159.57	32	256
6	江宁街道	乡村道	259.10	52	416
7	禄口街道	乡村道	101.33	21	168
8	秣陵街道	乡村道	168.91	34	272
9	麒麟街道	乡村道	61.67	13	104
10	汤山街道	乡村道	131.52	27	216
乡村道指路标志合计			1540.14	313	2504

(2) 安防设施

根据《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号）和交通运输部下发的《公路安全生命防护工程建设意见和实施方案》，我区于2017年印发《关于农村公路安全生命防护工程实施意见》（江宁政办发〔2017〕24号），明确用三年时间，完成全区所有县乡道农村公路安全生命防护工程建设。目前，我区已完成第一轮安防设施项目，基本消灭“隐患存量”。

《江苏省农村公路条例》第四十条要求，县（市、区）人民政府应当组织有关部门、乡镇人民政府定期排查农村公路安全隐患，按照国家 and 省有关规定实施安全生命防护工程。因此，从“不添增量”的角度出发，建议根据安全设施使用期限，定期进行维护更新，安全设施遭到损毁或者破坏的，及时进行修复或更新。

公路沿线环境、交通构成、安全状态等发生变化的，及时组织安全需求评估和设计，新增或调整相应的安全设施。今后农村公路安防设施项目列入常态化养护项目，根据实际调研需求，计划县道每年投资 400 万元，乡村道每年投资 678 万元，安防设施每年总投资 1078 万元。

（3）驿站设施

2018 年国家发改委发布《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2018 年-2020 年）（发改综合[2018]1465 号）》，提出鼓励在有条件的农村公路周边设置交通驿站等服务设施，完善交通旅游驿站配套服务体系，并支持乡村旅游驿站的用地预留。江苏省在 2018 年发布的《省政府关于进一步加强“四好农村路”建设的实施意见（苏政发[2018]66 号）》中也提出，要着力打造特色农路品牌，鼓励在农村公路路侧设置驿站、自驾车房车基地、环境基础设施等，提供停车、休憩、观景等服务功能。随着江宁全域旅游的深入发展，自驾游发展趋势明显，建议在景点附近沿路配套驿站，丰富包含停车休憩、补给用品售卖、公厕、路线查询等多重功能，设计建设包括驿站+公交站点、驿站+养护道班等相结合的组合布局方案，支撑国家全域旅游示范区建设。

经过与溧阳等先进区县对标分析，规划建设农村公路驿站 82 个。2021 年由各街道完成相应驿站建设实施方案，2022 年-2025 年间，计划建设完成一类驿站 11 个，二类驿站 16 个，三类驿站 55 个，各街道建设项目计划见表 5。建议各个街道结合实际，充分考虑用地资源约束，以“驿站+”发展模式打造农村公路综合服务体。

专栏：“驿站+”发展模式

以“人文驿站、绿色驿站、智慧驿站”为设计理念，布局三级驿站，将驿站与读书、党建、邮政、运输、公交管养等相结合，丰富驿站功能，集约化利用土地。其中，一级驿站主要结合明文化村(阳山碑材)、汤山紫清湖旅游区、牛首山文化旅游区、江宁台湾农民创业园、南山湖景区、雁南飞、银杏湖生态旅游区、大塘金香草谷、锁石生态旅游村、方山旅游度假、钱家渡等 11 个旅游景点布设；二级驿站主要结合县道布设； 驿站主要结合乡村道布设。三级驿站分别具备功能如下表。

设施类型	基本项目	一级驿站	二级驿站	三级驿站
管理服务设施	管理中心	●	○	-
	游客服务中心	●	●	-
配套商业设施	售卖点	●	○	○
	餐饮点	●	○	-
	自行车租赁点	●	○	○
游憩健身设施	活动场地	●	●	●
	休憩点	●	●	●
	眺望观景点	○	○	○
科普教育设施	解说	●	○	○
	展示	●	○	○
安全保障设施	治安消防点	●	○	-
	医疗急救点	●	○	-
	安全防护设施	●	●	●
	无障碍设施	●	●	●
环境卫生设施	厕所	●	●	●
	垃圾箱	●	●	●
停车设施	公共停车场	●	○	○
	出租车停靠点	●	○	-
	公交站点	●	○	-

●必须设置

○可以设置

- 不做要求

表 5 农村公路驿站建设项目

街道	一类驿站（个）					二类驿站（个）					三类驿站（个）					合计(个)
	2022	2023	2024	2025	合计	2022	2023	2024	2025	合计	2022	2023	2024	2025	合计	
淳化		1			1		1		1	2	1	2	2	2	7	10
东山					2			1		1	1	1	1		3	4
谷里	1	1				1		1		2	1	2	2	3	8	11
横溪								1		1	1	2	2	3	8	9
湖熟		1						1	1	2	1	1	2	2	6	8
江宁	1		1		2		1	1		2	1	2	2	3	8	12
禄口								1		1	1	1	1	1	4	5
秣陵	1	1			2		1	1		2	1	1	1	1	4	8
麒麟		1			1			1		1	1	1			2	4
汤山	1	1			2	1	1			2	2	2	1		5	9
合计	11					16					55					82

综上，未来五年计划完成指路标志、安防设施、驿站等相关配套设施项目，总投资约 2.6 亿元。

2021 年完 359 个交叉口的指路标志，80 公里县道安防设施，169.4 公里乡村道安防设施，总投资 3850 万元。

2022 年完成 313 个乡村道交叉口的指路标志，80 公里县道安防设施，169.4 公里乡村道安防设施，17 座驿站建设，总投资 5262 万元。

2023 年完成 313 个乡村道交叉口的指路标志，80 公里县道安防设施，169.4 公里乡村道安防设施，25 座驿站建设，总投资 6082 万元。

2024 年完成 313 个乡村道交叉口的指路标志，80 公里县道安防设施，169.4 公里乡村道安防设施，23 座驿站建设，总投资 5652 万元。

2025 年完成 313 个乡村道交叉口的指路标志，80 公里县道安防设施，169.4 公里乡村道安防设施，17 座驿站建设，总投资 4982 万元。

7.项目汇总

综上,未来五年江宁区计划完成农村公路提档升级、大中修、旅游道路建设、配套设施建设、危桥改造等多项建设任务,总投资约 47.1 亿元。

表 6 高质量提档升级工程建设规模

分类		2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
县道网	提档升级项目/km	5.3	4.9	2.8	6.4	6.8	26.2
	大中修/km	34.8	26.8	26.7	37.8	45.6	171.7
乡村道	提档升级项目/km	49.1	87.3	88.7	87.7	63.6	376.3
	大中修/km	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	385.0
旅游公路	美丽乡村旅游公路/km	32.6	14.1	26.8	18.5	23.7	115.7
配套设施	交通标志/个	359	313	313	313	313	1611
	安防设施/km	249.4	249.4	249.4	249.4	249.4	1247.1
	驿站/个	0	17	25	23	17	82
危桥改造	县道危桥/座	16	4	0	0	0	20
	乡村道危桥/座	40	37	0	0	0	77
总投资/亿元		8.8	9.7	9.7	9.9	9.0	47.1

注:建安费按县道提档升级标项目 450 万元/公里,乡村道提档升级项目 380 万元/公里,旅游公路新改建项目 450 万元/公里,征地拆迁费按 150 万元/公里测算。

县道大中修项目 450 万/公里,乡村道大中修项目 200 万/公里。

表 7 各街道高质量提档升级工程建设规模统计表

街道名称	分类	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
东山街道	提档升级/km	6.6	2.6	2.7	0.9	0.9	13.7
	大中修/km	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	26.4
	美丽乡村旅游公路/km	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口个数(指数标志项目)/个	22	22	22	22	22	110
	安防设施/km	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	58.0
	驿站/个	0	1	1	2	0	4

街道名称	分类	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
	乡村道危桥/座	3	0	0	0	0	3
秣陵街道	提档升级/km	5.8	6.9	9.7	12.2	9.3	44.0
	大中修/km	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	42.2
	美丽乡村旅游公路/km	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口个数(指数标志项目) / 个	34	34	34	34	34	170
	安防设施/km	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	92.9
	驿站/个	0	2	3	2	1	8
	乡村道危桥/座	6	6	0	0	0	12
汤山街道	提档升级/km	5.1	16.0	10.4	0.9	0.0	32.4
	大中修/km	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	32.9
	美丽乡村旅游公路/km	32.6	14.1	0.0	0.0	0.0	46.7
	交叉口个数(指数标志项目) / 个	27	27	27	27	27	135
	安防设施/km	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	72.3
	驿站/个	0	4	4	1	0	9
	乡村道危桥/座	6	5	0	0	0	11
淳化街道	提档升级/km	5.8	11.0	12.4	14.0	6.2	49.4
	大中修/km	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	43.4
	美丽乡村旅游公路/km	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	11.4
	交叉口个数(指数标志项目) / 个	35	35	35	35	35	175
	安防设施/km	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	95.6
	驿站/个	0	1	4	2	3	10
	乡村道危桥/座	5	5	0	0	0	10
禄口街道	提档升级/km	7.0	6.6	2.5	3.3	0.0	19.4
	大中修/km	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	25.3
	美丽乡村旅游公路/km	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7
	交叉口个数(指	21	21	21	21	21	105

街道名称	分类	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
	数标志项目) / 个						
	安防设施/km	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	55.7
	驿站/个	0	1	1	2	1	5
	乡村道危桥/座	0	2	0	0	0	2
江宁街道	提档升级/km	1.9	12.8	15.9	22.6	18.9	72.0
	大中修/km	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	64.8
	美丽乡村旅游公路/km	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口个数(指路标志项目) / 个	52	52	52	52	52	260
	安防设施/km	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	142.5
	驿站/个	0	2	3	4	3	12
	乡村道危桥/座	6	7	0	0	0	13
谷里街道	提档升级/km	7.1	3.0	1.6	1.6	0.0	13.3
	大中修/km	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	26.8
	美丽乡村旅游公路/km	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口个数(指路标志项目) / 个	22	22	22	22	22	110
	安防设施/km	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	58.9
	驿站/个	0	3	3	3	3	12
	乡村道危桥/座	3	4	0	0	0	7
湖熟街道	提档升级/km	3.1	8.2	10.7	10.0	11.5	43.4
	大中修/km	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	39.9
	美丽乡村旅游公路/km	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	26.8
	交叉口个数(指路标志项目) / 个	32	32	32	32	32	160
	安防设施/km	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	87.8
	驿站/个	0	1	2	3	3	9
	乡村道危桥/座	3	2	0	0	0	5
横溪街道	提档升级/km	9.6	19.4	21.8	21.3	16.9	88.9

街道名称	分类	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
	大中修/km	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	67.9
	美丽乡村旅游公路/km	0.0	0.0	0.0	7.1	19.0	26.1
	交叉口个数(指路标志项目) / 个	55	55	55	55	55	275
	安防设施/km	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	149.5
	驿站/个	0	1	2	3	3	9
	乡村道危桥/座	7	6	0	0	0	13
麒麟街道	提档升级/km	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大中修/km	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	15.4
	美丽乡村旅游公路/km	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口个数(指路标志项目) / 个	13	13	13	13	13	65
	安防设施/km	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	33.9
	驿站/个	0	1	2	1	0	4
	乡村道危桥/座	1	0	0	0	0	1

（二）技术标准

全区农村公路建设要认真执行国家及省市相关标准，包括《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、《农村公路养护技术规范》（JTG/T 5190-2019）和《江苏省农村公路条例》（2020 年 6 月 1 日实施）等文件要求，同时兼顾“经济适用、满足需求”的原则，因地制宜确定建设标准。其中，县道新改建三级公路路面宽度不低于 7m，路基宽度不低于 8.5m；乡村道及旅游道路新改建双车道四级公路路面宽度原则上不低于 6m（受限路段不低于 5.5m），路基宽度不低于 7m（受限路段不低于 6m）。

（三）政策原则

为确保项目落地实施，高效有序推进，乡村道配套设施项目（安防、交通标志、驿站）由街道具体负责建设，其他项目（提档升级、大中修、旅游公路、危桥等）由区交通运输局统一负责，按以下原则执行。

1) 统一立项、规划和设计。乡村道建设项目（提档升级、大中修、旅游公路、危桥）由街道委托区交通运输局代建，由区交通运输局统一报区行政审批局立项；规划和设计工作由区交通运输局和规资局江宁分局统一实施，各街道、各部门应积极配合。同时，每条农村公路的设计和建设不能单一化，需要因地制宜，从而加强工程建设的合理性。

2) 统一施工和监理招投标管理。提档升级、大中修、旅游公路、危桥等项目由区交通运输局统一施工，所有项目由交通运输局统一监理招标，择优选择实施单位，以加强工程前期管理，为工程质量的提升提供保障。

3) 统一施工管理。由区交通工程建设指挥部负责全过程的施工管理工作。

4) 统一质量监督，交、竣工验收。所有农村公路提档升级工程统一接受区交通工程质量监督站的全过程质量、安全监督。工程结束后由区交通运输局统一进行交、竣工验收。

5) 统一审计和支付。由区审计局将项目纳入政府投资审计计划，区交通运输局按工程进度进行计量审核，区财政局和街道给予支付。

6) 统一由街道负责征地、拆迁(含杆管线迁移)费用并协调解决相关地方矛盾，同时就近提供取（弃）土场。

四、保障措施

（一）加强组织领导

根据《多部门关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见（交公路发〔2019〕96号）》的要求，进一步加强组织建设工作，协调和解决工程实施中的重大问题。领导小组成员单位由区发改局、区财政局、区交通运输局、区审计局、规划和自然资源江宁分局、区城建局、区广电台、区交建集团、区城建集团、江宁供电公司、电信公司、移动公司、联通公司、各街道办事处组成，各成员单位要认真履行职责，密切协作配合，形成工作合力。领导小组办公室设在区交通运输局，具体负责工程建设总体方案制定，目标任务分解，统一图纸设计和招投标、技术指导和督查考核等工作。

（二）加强技术指导

区交通运输局应根据省、市农村公路提档升级工程技术标准和管理细则，在项目实施过程中，加大技术指导、质量监管和进度控制力度，确保按期保质完成农村公路提档升级建设任务。对具备拓宽建设条件的道路，要严格按照工程技术规范规定的等级公路标准要求进行达标改造，同步实施生命安全防护工程、绿化工程、驿站等服务设施。切实加强质量管理，提升农村公路整体水平。各街道要把农村公路提档升级工程与水利改造、村庄环境综合整治等工作结合起来，统筹安排，协同实施。要充分利用老路资源，尽量在原有基础上改扩建，利用原有土路肩进行拓宽，集约节约土地。

（三）强化资金保障

据测算，江宁区农村公路高质量提档升级工程共需投入资金47.1亿元，按县道、乡村道管理责任范围由区、街共同筹集，具体建设资金分摊方案由区交通运输局会同区财政局等相关单位另行制定。同时，争取将本轮农路项目纳入省、市相关规划项目库，积极争取省、市补助资金。

表8 江宁区高质量提档升级工程年度投资统计表

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
投资（亿元）	8.8	9.7	9.7	9.9	9.0	47.1

（四）深入宣传发动

要广泛开展宣传教育，大力宣传实施农村公路提档升级工程的重要意义，各级政府应采取有效措施，引导农民群众增强交通安全意识和护路意识，动员广大农民群众和社会各界通过村级公益事业“一事一议”、村集体经济收入以及鼓励社会力量捐资捐建等方式，积极支持和参与农村公路提档升级工程建设，努力形成全社会关心、支持和参加工程建设的良好氛围。

（五）严格督查考核

农村公路提档升级工程纳入区政府年度目标任务综合考核。各街道要高度重视并将之纳入政府工作目标责任考核体系，做好征地、拆迁资金筹措等工作，并严格执行中央和省、市关于减轻农民负担的各项规定，不得乱摊派、乱集资、乱收费，不得强行要求农民出工出物出钱和增加农民负担，要切实强化资金使用管理，做到专款专用。建立健全激励约束机制，将考核结果与财政补助资金挂钩，对工作推进情况良好的，给予奖励或增量补贴；对工作推进情况较差的，实行约谈、责令整改、扣减补贴等措施，

充分发挥激励考核“指挥棒”效应。交通运输主管部门要会同区纪检、监察部门等有关部门定期开展监督检查，确保把农村公路提档升级工程打造成优质工程、平安工程、廉政工程。

附表 1 南京市江宁区县道网提档升级工程实施序列表

序号	项目位置			长度 (M)	目前技术状况		规划技术等级			改造时间
	线路名称	起讫点桩号	大致位置		现状路面类型	宽度 (M)	规划等级	路面类型	宽度 (M)	
1	X003 江汤线	K29+185-K30+200	欣旺到火炬段	1015	沥青砼路面	4.5-5	三级	沥青砼路面	7	2021
		K37+400-K38+700	S002 与九龙路交叉至龙都转盘	1300	沥青砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2021
		K57+300-K60+300	与青赤路交叉至邵家边	3000	沥青砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2021
2	X002 板汤线	K46+400-K49+300	小川藏线段	2900	沥青砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2022
3	X101 湖周线	K0+400-K1+900	起点至高阳桥下桥	1500	其中 K0+400-K0+600 沥青砼路面	5.3	三级	沥青砼路面	7	2022
					其中 K0+600-K1+600 水泥砼路面	5.3	三级	沥青砼路面	7	2022
					其中 K1+600-K1+900 沥青砼路面	5.4	三级	沥青砼路面	7	2022
		K5+200-K5+700	南京华飞服饰有限公司大门至周岗敬老院	500	沥青砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2022

序号	项目位置			长度 (M)	目前技术状况		规划技术等级			改造时间
	线路名称	起讫点桩号	大致位置		现状路面类型	宽度 (M)	规划等级	路面类型	宽度 (M)	
4	X303 黄徐线	K15+200-K16+800	插花至青龙山顶	1600	K15+200-16+100 沥青砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2023
					K16+100-16+800 水泥砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2023
		K0+000-K0+650	曹家庄段	650	水泥砼路面	5	三级	沥青砼路面	7	2023
		K27+800-K28+300	咸田社区苏庄村段	500	沥青砼路面	5	三级	沥青砼路面	7	2023
5	X306 铜濮线	K0-K1	曹村	1000	沥青砼路面	5-6	三级	沥青砼路面	7	2024
		K20+400-K21+400	红旗社区窑头村段	1000	沥青砼路面	4	三级	沥青砼路面	7	2024
6	X202 青郭线	K1+600-K2+900	绕黄龙埵水库段	1300	沥青砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2024
7	X102 上高线	K5+600-K7+100	神路口至高桥	1500	沥青砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2024
8	X106 孙西线	K13-K13+600	西宁社区段	500	沥青砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2024
9	X206 定陆线	K16+700-K17+800	花塘社区段	1100	沥青砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2024
10	X203 天龙线	K9+200-K13+500	葛桥至与S002交叉	4300	其中 K9+200-K9+500 水泥砼路面	4.8	三级	沥青砼路面	7	2025
					其中 K9+500-K9+800 沥青砼路面	5	三级	沥青砼路面	7	2025

序号	项目位置			长度 (M)	目前技术状况		规划技术等级			
	线路名称	起讫点桩号	大致位置		现状路面类型	宽度 (M)	规划等级	路面类型	宽度 (M)	改造时间
					其中 K9+800-K11+300 水 泥砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2025
					其中 K11+300-K13+500 沥青砼路面	5	三级	沥青砼路面	7	2025
		K13+400-K14+100	与 S002 交叉 至终点	700	沥青砼路面	5.1	三级	沥青砼路面	7	2025
11	X301 燕西线	K1+394-K3+194	起点至南京 工程高等职业 学院	1800	沥青砼路面	6	三级	沥青砼路面	7	2025
合计				26165						

附表 2 南京市江宁区乡村道提档升级工程实施序列表

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
1	淳化街道	茶果厂南延路	淳化茶果厂	里墅	0.8	3	水泥	6	沥青	2021
2	淳化街道	严子路	石子涧	严家边	0.4	3	砂石	6	沥青	2021
3	淳化街道	大山凹东路	老 104 国道	村中停车场	0.5	3	水泥	6	沥青	2021
4	淳化街道	窑厂路	湖土路	西湖渔场	1.1	3	沥青	6	沥青	2021
5	淳化街道	土下线	土远路	下庄村	1.5	3.5	水泥路	6	沥青	2021
6	淳化街道	后七路	后村	七里岗	1.5	3.5		6	沥青	2021
7	淳化街道	涧西线	淳马线	涧边村	1			6	沥青	2022
8	淳化街道	万家边村西路	蔡家湾路	万家边村	0.35	6	砂石	7	沥青	2022
9	淳化街道	青龙大道	邓家庄村	汤铜路	3.7	10	沥青路	10	沥青	2022
10	淳化街道	大城村西路	青龙大道	公墓停车场	0.65	8	水泥路	8	沥青	2022
11	淳化街道	青龙中路	鑫淼龙锦园	青龙幼儿园	0.92	10	沥青路	10	沥青	2022
12	淳化街道	云上路	青山幼儿园	上堰	1.5	6.5	沥青	7	沥青	2022
13	淳化街道	旱河路	西湖闸	焦头湖闸	2.1	6	沥青	7	沥青	2022
14	淳化街道	吴家渡北路	一号沟 4 号桥	吴家渡	0.75	3.5	水泥路	6	沥青	2022
15	淳化街道	园林路	镇东村	索青路	1.5	3	石子路	6	沥青	2023
16	淳化街道	前桥头路	焦头湖闸	淳马线路口	0.9	6	沥青	7	沥青	2023
17	淳化街道	新陵北路	淳大路	新陵北	10	3.5		6	沥青	2023
18	淳化街道	祁家边村西连接线	吴墅社区 68 号	祁家边	0.3	3	砂石	6	沥青	2024
19	淳化街道	巷马路	淳马线	巷上村	1.2			6	沥青	2024

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面类型	宽度 (M)	路面类型	
20	淳化街道	新采路	庄中路	新采路	5	3.5		6	沥青	2024
21	淳化街道	庄中路	庄中路西	庄中路北	3	3.5		6	沥青	2024
22	淳化街道	松苏路	苏庄	松岗庙	4.5	2		6	沥青	2024
23	淳化街道	洪涧路	洪墅	索墅涧西	1.2	2.5	砂石	6	沥青	2025
24	淳化街道	洪祁路	祁家边村	洪墅村	0.8	2.5	砂石	6	沥青	2025
25	淳化街道	郭村南路	龙眠大道口	新林雨水泵站	1.2	5	沥青、石子	6	沥青	2025
26	淳化街道	郭村西路	郭村中村停车场	福英路	3	3	泥土	6	沥青	2025
27	东山街道	上余路	梨花谷入口	孙家公厕	2.7	7	沥青	7	沥青	2021
28	东山街道	上桃路至众彩物流路	上桃路	众彩物流	0.96	6	水泥	7	沥青	2021
29	东山街道	上桃路至山里路	上桃路	山里村	0.8	6	水泥	7	沥青	2022
30	东山街道	山下村路	104 国道	山下村	0.5	5	水泥路	6	沥青	2022
31	东山街道	七社路	保洁队	喇叭桥	2.1	4.5	柏油路面	6	沥青	2022
32	东山街道	双麒路至富民路	双麒路	富民路	1.1	6	水泥	7	沥青	2023
33	东山街道	上余路	104 国道	宝鼎路	1.5	6	沥青路	7	沥青	2023
34	东山街道	孙家路	小社公厕	新光商店	1.2	4	柏油路面	6	沥青	2023
35	东山街道	富民路至卢家桥	富民路	卢家桥	1	4	泥土	6	沥青	2024
36	东山街道	连塘路	青龙桥	幼儿园	0.9	6	柏油路面	7	沥青	2024

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面类型	宽度 (M)	路面类型	
37	东山街道	庄前路	九龙广场	李家村	0.9	6	柏油路面	7	沥青	2025
38	谷里街道	雅庆路	六家庄	山头吴	1.1	3.5	水泥	6	沥青	2021
39	谷里街道	公山寺路	地海印刷厂	公山寺村口	0.6	4	水泥	6	沥青	2021
40	谷里街道	新塘路	旅游大道	破塘桥	0.6	2.8	水泥	6	沥青	2021
41	谷里街道	小丁家路	陈建林门口	李昌华门口	0.6	2.2	沥青	6	沥青	2021
42	谷里街道	石塘张路	盛华龙门口	张拥友门口	0.2	2.5	碎石	6	沥青	2021
43	谷里街道	中心沟路	店门口涵洞	陈村	2	4	水泥	6	沥青	2021
44	谷里街道	岗湾路	鄂儿岗	大马湾	2	7	水泥	7	沥青	2021
45	谷里街道	鸡儿岗进村道路	正方大道进村路口	鸡儿岗停车场	0.5	3	水泥	6	沥青	2022
46	谷里街道	鸡儿岗进村道路	龚邦亮处	鸡儿岗公共厕所		3	水泥	6	沥青	2022
47	谷里街道	蔡家路	蔡家	王孝义门口	0.5	2.5	水泥	6	沥青	2022
48	谷里街道	银雅路	银杏湖大道	雅塘杨村	2	3	碎石	6	沥青	2022
49	谷里街道	新集镇路	薛塘	小栏杆	0.4	4	水泥	6	沥青	2023
50	谷里街道	远香路	小圩子	小甘里	1.2	4.5	水泥	6	沥青	2023
51	谷里街道	王孟路	王村	孟水桥	0.5	3	水泥	6	沥青	2024
52	谷里街道	大柏树至大塘角路	大柏树	大塘角	1.1	4	碎石	6	沥青	2024
53	横溪街道	王马场支路	水库管理房	大南塘	0.2	2.5	水泥	6	沥青	2021
54	横溪街道	大孙路	大朋进村	孙家庄进村	0.54	3	水泥	6	沥青	2021
55	横溪街道	古市	古市村中	古市村东	0.26	3	水泥	6	沥青	2021

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
56	横溪街道	新庄	大礼塘	董存银	0.6	3	水泥	6	沥青	2021
57	横溪街道	小夏路	铜濮线 X306	小夏庄	0.11	3	水泥	6	沥青	2021
58	横溪街道	陈家路	铜濮线 X306	小陈家	0.11	3	水泥	6	沥青	2021
59	横溪街道	谭家路	铜濮线 X306	谭家	0.25	3	水泥	6	沥青	2021
60	横溪街道	榨槽路	铜濮线 X306	榨槽子	1.6	3.5	水泥	6	沥青	2021
61	横溪街道	曾庄路	铜濮线 X306	曾庄	0.8	3.5	水泥	6	沥青	2021
62	横溪街道	张家路	铜濮线 X306	张家	0.98	5	水泥	6	沥青	2021
63	横溪街道	陶园路	宁丹路	小桃村	1.3	3.5	水泥	6	沥青	2021
64	横溪街道	横北路	横云路	北胜	0.7	3.5	水泥	6	沥青	2021
65	横溪街道	盛家路	盛家	盛坳	0.9	3	水泥	6	沥青	2021
66	横溪街道	高盛路	高台村	盛坳	0.6	3	水泥	6	沥青	2021
67	横溪街道	大桥路	大桥村	大桥村	0.2	2	水泥	6	沥青	2021
68	横溪街道	丹朱路	丹向路	朱高路	0.3	2	水泥	6	沥青	2021
69	横溪街道	姜长路支线	牛塘上跨桥	原长冲村部	0.15	3	水泥	6	沥青	2021
70	横溪街道	棕二路	宁丹路	二塘村	1	3	水泥	6	沥青	2022
71	横溪街道	船上路	船上村	涧北村	0.4	3.5	水泥	6	沥青	2022
72	横溪街道	山下桥支路	山下桥路口	山下桥	0.8	2.5	水泥	6	沥青	2022
73	横溪街道	蔡西路	蔡坎路岔路	西汤村	0.38	3	水泥	6	沥青	2022
74	横溪街道	夏家甸路	霞家甸西	夏家甸南	0.3	4	机耕	6	沥青	2022
75	横溪街道	枣树岗路	吴楚东路	枣树岗	0.5	2.5	水泥	6	沥青	2022
76	横溪街道	翟家边路	华商路	翟家边	1	3	水泥	6	沥青	2022

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面类型	宽度 (M)	路面类型	
77	横溪街道	横杜路	横云路	杜林	0.3	5.5	水泥	6	沥青	2022
78	横溪街道	横前路	横云路	前东	0.7	3.5	水泥	6	沥青	2022
79	横溪街道	杜横路	社塘	横云路	1	4.5	水泥	6	沥青	2022
80	横溪街道	横西路	横云路	西冲	0.6	5	水泥	6	沥青	2022
81	横溪街道	前鸭路	前坎	鸭塘	0.9	3	机耕	6	沥青	2022
82	横溪街道	东步路	东河黄塘	步子桥	1.6	3	石子路	6	沥青	2022
83	横溪街道	前庄环村路	陶云路	前陶路	2	4	石子路	6	沥青	2022
84	横溪街道	茶厂路	340 省道	金村路	1.4	2.5	石子路	6	沥青	2022
85	横溪街道	朱村	南大门	园区门岗	1.9	3	水泥路	6	沥青	2022
86	横溪街道	南山坎	云台山	沽塘	0.8	3	碎石、水泥路	6	沥青	2022
87	横溪街道	龙山大道	朱山口	断腰口	2.85	5	水泥路	6	沥青	2022
88	横溪街道	华安路	华商路	安民河埂	0.98	3	碎石	6	沥青	2022
89	横溪街道	湖二路	湖头路一期	将军路	1.5	1	泥土	6	沥青	2023
90	横溪街道	梅村	四亩坝	宁光山桥	0.8	5	水泥	6	沥青	2023
91	横溪街道	大夏路	铜濮线 X306	大夏庄	0.43	5	水泥	6	沥青	2023
92	横溪街道	发山路	发旺村	陡山桥	0.45	3	机耕	6	沥青	2023
93	横溪街道	上牛路	上湾塘	牛奶窝	0.21	2.5	机耕	6	沥青	2023
94	横溪街道	横禄路	红杨墅村	邵村	3	4.5	水泥、沥青	6	沥青	2023
95	横溪街道	向峰路	丹向路	吴峰新村	0.5		水泥	6	沥青	2023

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
96	横溪街道	泗大路	泗陇路	大桥村	0.15	2	水泥	6	沥青	2023
97	横溪街道	双孙路	双河抗旱站	孙盖村西	1.6	3	水泥	6	沥青	2023
98	横溪街道	前迎路	前旺村	迎驾路	0.95	2.5	水泥路	6	沥青	2023
99	横溪街道	风塘	龙山大道	红星大道	1.5	3	水泥路	6	沥青	2023
100	横溪街道	大上路	社区路	红星大道、村庄路	1.1	5	水泥路	6	沥青	2023
101	横溪街道	红星大道	桃红楼	北大门	4.08	5	水泥路	6	沥青	2023
102	横溪街道	化工路	羽绒厂	小金坳	2	5	水泥路	6	沥青	2023
103	横溪街道	牛蒡线支线	雇冲中桥	雇冲村	0.18	2	机耕	6	沥青	2023
104	横溪街道	丹西路	丹阳新桥	西河村	1.3	0	机耕	6	沥青	2023
105	横溪街道	北南路	北胜	南山	2	3	机耕	6	沥青	2023
106	横溪街道	新房路	水库岔路	陈益民门口	0.5	3	水泥	6	沥青	2024
107	横溪街道	倪家店路	倪家店	古市水库	1	3.5	水泥	6	沥青	2024
108	横溪街道	双钟路	双庙路	钟家塘	0.4	3.5	水泥	6	沥青	2024
109	横溪街道	窑村路	窑岗路	窑村	2.2	3	石子路	6	沥青	2024
110	横溪街道	金村路	340 省道	茅山凹	5.5	5	沥青路	6	沥青	2024
111	横溪街道	红星村	红星大道	任建华	0.73	3	水泥路	6	沥青	2024
112	横溪街道	余家	变电所	吴克生家	1.35	3	水泥路	6	沥青	2024
113	横溪街道	云台西路	汤铜路	杭村	0.8	4	水泥	6	沥青	2024
114	横溪街道	红土岗路	许村	大官塘路	1.4	4	水泥	6	沥青	2024
115	横溪街道	大砚路	旅游大道	泊塘幽谷山庄	1.2	4	水泥	6	沥青	2024

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面类型	宽度 (M)	路面类型	
116	横溪街道	姜长路	李园村	340 省道	0.5	4	水泥	6	沥青	2024
117	横溪街道	大官塘路	大官塘	大柏塘	1.3	4	水泥	6	沥青	2024
118	横溪街道	青北路	青龙埂	北胜	1.5	4	水泥	6	沥青	2024
119	横溪街道	姜家路	铜濮线 X306	姜家	0.37	4.5	水泥	6	沥青	2024
120	横溪街道	七仙路	勇跃现代农业园	丹阳社区	2.5	3.5	石子	6	沥青	2024
121	横溪街道	高福路	朱高	大福村	0.2	2	水泥	6	沥青	2025
122	横溪街道	西高路	西岗小区	朱高村	0.5	3	水泥	6	沥青	2025
123	横溪街道	双凤路	双庙	凤凰岭	2	4	水泥	6	沥青	2025
124	横溪街道	赵村路	340 省道	金村路	4.5	5	沥青路	6	沥青	2025
125	横溪街道	徐附岗	徐附村	徐附岗上跨桥	0.3	2	机耕	6	沥青	2025
126	横溪街道	陶汉路	陶高	汉塘	0.7	2	砂石	6	沥青	2025
127	横溪街道	溪跃路	溪田农业	踊跃社区	3.8	3	水泥	6	沥青	2025
128	横溪街道	姜王路	大牛王村	姜林村	0.9	3.5	水泥	6	沥青	2025
129	横溪街道	机耕路	姜王路	省道 340	0.3	2.5	碎石	6	沥青	2025
130	横溪街道	甘家山支线	甘家山路	工业园	0.8	3	碎石	6	沥青	2025
131	横溪街道	牛喜路支线	牛喜路	喜神张村	0.3	3	碎石	6	沥青	2025
132	横溪街道	成林路	340 省道	成林村	0.3	2.5	石子路	6	沥青	2025
133	横溪街道	马郎路	340 省道	马郎岗	0.6	3	水泥路	6	沥青	2025
134	横溪街道	新生路	340 省道	新生	0.35	3	水泥	6	沥青	2025
135	横溪街道	清塘路	旅游大道	青草堤	0.5	3	水泥	6	沥青	2025
136	横溪街道	渣塘	汤铜路	陈宜生	0.8	2.5	碎石水	6	沥青	2025

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
							泥			
137	湖熟街道	涵林线	涵头上	林家庄	1.79	4	水泥	6	沥青	2021
138	湖熟街道	下钱线	下杨村	钱家	1.314	4	水泥	6	沥青	2021
139	湖熟街道	南东线	南庄	东北村	1.851	4	水泥	6	沥青	2022
140	湖熟街道	湖赵线	湖土路	汤铜路	1.3	4	水泥	6	沥青	2022
141	湖熟街道	龙南线	龙林路	南窑村	1.58	4	水泥	6	沥青	2022
142	湖熟街道	龙夏线	龙林路	夏庄	1.685	3	水泥	6	沥青	2022
143	湖熟街道	龙梅线	龙秦路	梅村	0.58	3	水泥	6	沥青	2022
144	湖熟街道	龙冬线	龙葛线	东库村	1.181	3	水泥	6	沥青	2022
145	湖熟街道	湖友线	汤铜路	曹家边	2.032	4	水泥	6	沥青	2023
146	湖熟街道	东西路	东阳村委会	西河南	0.904	3	水泥	6	沥青	2023
147	湖熟街道	湖东路	湖龙路	东阳圩	0.859	3	水泥	6	沥青	2023
148	湖熟街道	湖山路	湖塘头	山里王	0.846	3	水泥	6	沥青	2023
149	湖熟街道	湖东路	湖龙路	东时村	0.608	3	水泥	6	沥青	2023
150	湖熟街道	湖杨线	湖龙线	杨家庄	0.866	3	水泥	6	沥青	2023
151	湖熟街道	咸东线	咸周线	东岗头	0.801	3	水泥	6	沥青	2023
152	湖熟街道	新栾线	栾马村	新府村	1.3	3	水泥	6	沥青	2023
153	湖熟街道	淳新线	淳马线	新府村停车场	1	3	水泥	6	沥青	2023
154	湖熟街道	栾湖线	栾马村	湖塘头	0.7	3	水泥	6	沥青	2023
155	湖熟街道	杨夏线	杨家村	王夏路	0.78	3	水泥	6	沥青	2023
156	湖熟街道	油陈线	油榨桥	陈家边	0.542	3	水泥	6	沥青	2024

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
157	湖熟街道	湖皮路	湖新线	皮家庄	0.33	3	水泥	6	沥青	2024
158	湖熟街道	湖窑路	湖土线	窑头	0.632	3	水泥	6	沥青	2024
159	湖熟街道	后淳路	后山岗	淳岗线	0.737	3	水泥	6	沥青	2024
160	湖熟街道	淳石路	淳溧线	石涵头	0.798	3	水泥	6	沥青	2024
161	湖熟街道	窑西路	窑厂	西冲	0.884	3	水泥	6	沥青	2024
162	湖熟街道	龙刘线	龙秦路	刘家汾前	0.597	3	水泥	6	沥青	2024
163	湖熟街道	上许线	上浦塘	许家	0.53	3	水泥	6	沥青	2024
164	湖熟街道	龙西路	龙秦路	西北村	0.604	3	水泥	6	沥青	2024
165	湖熟街道	刘源线	刘村	淮源村委会	0.642	3	水泥	6	沥青	2024
166	湖熟街道	沙大线	沙场	大陆渡	0.651	3	水泥	6	沥青	2024
167	湖熟街道	咸余路	咸汤线	余家渡	0.687	3	水泥	6	沥青	2024
168	湖熟街道	咸养路	咸解路	养殖场	0.697	3	水泥	6	沥青	2024
169	湖熟街道	咸李线	咸解路	李家	0.782	3	水泥	6	沥青	2024
170	湖熟街道	句东线	句容	东释村	0.774	3	水泥	6	沥青	2024
171	湖熟街道	淮龙路	淮源村委会	龙秦路	0.106	3	水泥	6	沥青	2024
172	湖熟街道	汤西路	S337	湖土线	1.178	3	水泥	6	沥青	2025
173	湖熟街道	新湖河线	S002	刑家庄	2.464	3	水泥	6	沥青	2025
174	湖熟街道	高李线下放	高阳村	高李村委会	0.335	3	水泥	6	沥青	2025
175	湖熟街道	尧冲线下放	尧上	淳溧线	0.983	3	水泥	6	沥青	2025
176	湖熟街道	村前线下放	和进村委会	前山岗	0.807	3	水泥	6	沥青	2025
177	湖熟街道	焦章线下放	焦公渡	章斤后	0.911	3	水泥	6	沥青	2025

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
178	湖熟街道	龙涵线下放	龙秦路	涵头上	1.134	3	水泥	6	沥青	2025
179	湖熟街道	龙南线下放	龙林路	南窑村	1.535	3	水泥	6	沥青	2025
180	湖熟街道	俞盖后线	俞盖后村	村中停车场	0.272	3	水泥	6	沥青	2025
181	湖熟街道	俞盖西线	俞盖西村停车场	俞盖七组荷花塘	0.339	3	水泥	6	沥青	2025
182	湖熟街道	后友线	后西村	友凤路	0.173	3	水泥	6	沥青	2025
183	湖熟街道	湖高线	湖周路	高阳桥村	0.221	3	水泥	6	沥青	2025
184	湖熟街道	前湖线	前山岗	湖土路	1.1	3	水泥	6	沥青	2025
185	江宁街道	汤高路	汤铜路	高场	1	3	水泥	6	沥青	2021
186	江宁街道	顾上到胡上	陈先禄家	胡其传家	0.15	2	水泥路	6	沥青	2021
187	江宁街道		观西	关西休闲广场	0.3	3	水泥	6	沥青	2021
188	江宁街道	徐府路 1	徐府线	徐府	0.18	2.5	水泥路	6	沥青	2021
189	江宁街道	徐府路 2	徐府线	柏官线	0.23	2.5	土路	6	沥青	2021
190	江宁街道	吴庄线	吴庄一队	吴庄二队	1	2.5	水泥路	6	沥青	2022
191	江宁街道	村道	戴家史长江门口	大庙老村部	0.3	3	水泥路	6	沥青	2022
192	江宁街道	大塘路	村入口	队长家	0.2	3	水泥路	6	沥青	2022
193	江宁街道	村道	印刷厂	唐家村	1	4	水泥路	6	沥青	2022
194	江宁街道	郭石线	郭塘村	石山村	1.5	3	水泥路	6	沥青	2022
195	江宁街道	王河线	王场	江宁河	1.5	2	水泥路	6	沥青	2022
196	江宁街道	小店线	小店	木材市场	1	2	水泥路	6	沥青	2022
197	江宁街道	村道	旅游大道朱大线	杨家大山	1.3	4	砂石	6	沥青	2022

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
198	江宁街道	汤独路	汤铜路高楼子	独龙	0.93	3	土路、水泥	6	沥青	2022
199	江宁街道	东场路	宁汤线	东场前	0.4	3	水泥路	6	沥青	2022
200	江宁街道	石门路	宁汤线	石门李	0.22	3	水泥路	6	沥青	2022
201	江宁街道	富贵山路	G205	富贵山	0.8	4	石子路	6	沥青	2022
202	江宁街道	大高楼路	高楼村头	高楼村尾	1	3	水泥	6	沥青	2022
203	江宁街道	直山路	王方元门口	枯桩村标	0.3	5	水泥	6	沥青	2022
204	江宁街道	朱龙路	朱家村	龙坊路	0.46		农田	6	沥青	2022
205	江宁街道	村道	官塘	官塘水库	0.5	3	砂石路	6	沥青	2022
206	江宁街道	陈上路	陈上公厕	水库路	0.4	2	水泥路	6	沥青	2022
207	江宁街道	汤兴路	汤铜路	兴纪	0.92	2.5	砂石	6	沥青	2023
208	江宁街道	江上线	窑山	石山	1.5	3.5	水泥路	6	沥青	2023
209	江宁街道	徐府线	土桥头	正方大道	0.85	3	水泥路	6	沥青	2023
210	江宁街道	村道	印刷厂	新建村	1	4	水泥路	6	沥青	2023
211	江宁街道	双北路	双虎村	北庄村	3	3	水泥路	6	沥青	2023
212	江宁街道	红岗陆郎	红岗	陆郎	0.35	2.5	水泥	6	沥青	2023
213	江宁街道	纪小路	正方大道	纪小	0.5	2.5	砂石路	6	沥青	2023
214	江宁街道	金塘路	福慈线	小山坎村	0.4	1	土路	6	沥青	2023
215	江宁街道	施山路	郑之录房后	丁仕真房后	0.8	3	水泥	6	沥青	2023
216	江宁街道	解放路	环山河路	高承富房后	0.2	1	土路	6	沥青	2023
217	江宁街道	朱西线	小吴家	牌坊	0.5		农田	6	沥青	2023

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
218	江宁街道	黄头路	正方大道	峭山林场	1.5	3.2	水泥路	6	沥青	2023
219	江宁街道	寿庄路	工业园	王国涛家	0.1	3	水泥路	6	沥青	2023
220	江宁街道	黄头小路	陈福斌门口	陈福友门口	0.25	3	水泥路	6	沥青	2023
221	江宁街道	工业园路	工业园入口	黄头停车场	0.12	4	水泥路	6	沥青	2023
222	江宁街道	村道	糟坊	江宁西站	1.5	2.5	水泥、土 路	6	沥青	2023
223	江宁街道		糟坊	江宁西站	1.5	2.5	水泥、土 路	6	沥青	2023
224	江宁街道	庆丰路 1	宁汤线	庆丰	0.52	2.5	水泥路	6	沥青	2023
225	江宁街道	庆丰路 2	宁汤线	庆丰	0.374	2.5	水泥路	6	沥青	2023
226	江宁街道	环山河路	战备水库	施山	3	3	水泥	6	沥青	2024
227	江宁街道		旅游大道庙下口	韩村西山	2.5	2	水泥、土 路	6	沥青	2024
228	江宁街道	村道	千里村	高山水库	1		水泥	6	沥青	2024
229	江宁街道	潘祁路	福慈线	潘祁村	0.6	1	土路	6	沥青	2024
230	江宁街道	村道	后城	向基坝	0.7	2.8	水泥	6	沥青	2024
231	江宁街道	度假村路	光大垃圾站	南山清苑	2.5	3	水泥路	6	沥青	2024
232	江宁街道	山水河路	福慈线	高杨程	1	3	柏油路	6	沥青	2024
233	江宁街道	高丰路 1	宁汤线	高丰	0.33	2.5	水泥路	6	沥青	2024
234	江宁街道	高丰路 2	宁汤线	高丰	0.37	2.5	水泥路	6	沥青	2024
235	江宁街道	东水桥路 1	宁汤线	东水桥	0.43	2.5	沥青	6	沥青	2024
236	江宁街道	后稍路	后稍线	后稍河道	0.23	2.5	水泥路	6	沥青	2024

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (kM)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
237	江宁街道	二牧线	杏塘	工业园区	1	4.5	沥青	6	沥青	2024
238	江宁街道	林李线	李家大村	李村林场	2.5	6	水泥	7	沥青	2024
239	江宁街道	钱中线	钱家村	中庄村	2.5	1.5	机耕路	6	沥青	2024
240	江宁街道	二天线支线	陶塘岗涵洞	大保村	0.9	7.5	砂石	7.5	沥青	2024
241	江宁街道	祠盛路	祠堂	大西线盛家段	0.6	4.5	水泥路	6	沥青	2024
242	江宁街道	村道	孙家冲	大山南	1.6	4	砂石	6	沥青	2024
243	江宁街道	江横线官山支线	官山	梅府庄	0.4	4.5	水泥	6	沥青	2024
244	江宁街道	铜虹街	铜井农桥	福兴街	0.4	6	沥青	7	沥青	2024
245	江宁街道	乌庄路	海宏大道	乌庄村	0.4	4	水泥路	6	沥青	2025
246	江宁街道	南盛路	南门大西塘	盛家	0.4	4	水泥路	6	沥青	2025
247	江宁街道	杭家线	杭家	中村	0.3	4	砂石路	6	沥青	2025
248	江宁街道	村道	史家大塘口	小山南	0.8	4	砂石	6	沥青	2025
249	江宁街道	叶福路	铜井幼儿园	鸡圩泵站	0.95	4	半水泥 半沥青	6	沥青	2025
250	江宁街道	村道	花塘中学	南门后队	2	4	水泥	6	沥青	2025
251	江宁街道	江花线	花卉园路口	院子瑶山口	2	5	柏油	6	沥青	2025
252	江宁街道	庙东路	金太平家	马如全家	0.1	2.2	水泥路	6	沥青	2025
253	江宁街道	庙东小路	金太明	金盛保家	0.15	2.5	水泥路	6	沥青	2025
254	江宁街道	汤俞线	俞村	汤铜路	1	4	水泥路	6	沥青	2025
255	江宁街道	村道	印刷厂	牌坊村	1	4	水泥路	6	沥青	2025
256	江宁街道	宁安线	宏宇厂房	上坝村	2.5	3	砂石路	6	沥青	2025

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面类型	宽度 (M)	路面类型	
257	江宁街道	度假村路	度假村	度假村	5	3	水泥路	6	沥青	2025
258	江宁街道	高桥到许场	沿河路	芝林路	1	4	水泥路	6	沥青	2025
259	江宁街道	五连塘路	五连塘	朱门牌楼	1.3	5	水泥	6	沥青	2025
260	禄口街道	护驾坊村后道路	胡孝荣家	刘盖头路	0.5	4	水泥	6	沥青	2021
261	禄口街道	后周路	振兴路	前周家冲	1	3	水泥	6	沥青	2021
262	禄口街道	南夏村村西农路	南夏村村西	宁高新通道	0.27	3	沥青	6	沥青	2021
263	禄口街道	坂石路	五圩路	坂田埂村头	0.4	3	水泥	6	沥青	2021
264	禄口街道	梁彭高家路	东梁路	高家村头	0.25	4	水泥	6	沥青	2021
265	禄口街道	双堰北路	双堰小区西北	金航路	0.25	5	土	6	沥青	2021
266	禄口街道	程业路	迎驾路	张业村	0.2	3	沥青	6	沥青	2021
267	禄口街道	谢绿路	横峰街	金陵绿谷	0.6	6	沥青	7	沥青	2021
268	禄口街道	子埂路	扬子路	子埂村	0.14	5.5	水泥	6	沥青	2021
269	禄口街道	刘家西路	成杨路	刘家村	0.22	4	沥青	6	沥青	2021
270	禄口街道	杨家进村路	马铺路	杨家村	0.25	3	水泥	6	沥青	2021
271	禄口街道	李家-汤铜路	李家村路	汤铜路	0.55	2	石子	6	沥青	2021
272	禄口街道	荷花地渔场路	荷花地村	刘家村停车场	1.2	2.5	石子	6	沥青	2021
273	禄口街道	久阳路	禄铜路	铜山派出所	0.75	3.5	水泥	6	沥青	2021
274	禄口街道	庄盖村路	禄铜路	民航之星快捷酒店	0.45	5	水泥	6	沥青	2021
275	禄口街道	秦村路	禄口街道垃圾分类 中转站(奶牛场)	一干河（达练 岗3号泵站）	0.5	5	石子路	6	沥青	2022

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
276	禄口街道	村路	刘伯温大桥	山阴村大桥	0.785	5	路面损坏	6	沥青	2022
277	禄口街道	双岛湖路	张敏村东	王家渡西	3.05	4.2	沥青	6	沥青	2022
278	禄口街道	埂方路	大埂头入村口	五圩路	2.3	3	水泥	6	沥青	2022
279	禄口街道	村路	山阴村大桥	北拐	1.35	5	700 砂石路	6	沥青	2023
280	禄口街道	村路	欢墩山无底塘	张欢路	0.34	2.5	砂石路	6	沥青	2023
281	禄口街道	村路	山阴村王氏祠堂	大塘水库	0.51	5	350 米砂石路	6	沥青	2023
282	禄口街道	村路	养狗厂房	秦淮河圩堤	0.16	5	水泥	6	沥青	2023
283	禄口街道	后陈巷道路	胡孝保家	地铁	0.1	2	水泥	6	沥青	2023
284	禄口街道	新周路	宁高新通道	后周家冲前周家冲	1.25	3	水泥	6	沥青	2024
285	禄口街道	田园路	宁高新通道	高山范	1.2	3	水泥	6	沥青	2024
286	禄口街道	范家路	迎驾路	范家	0.8	4	水泥	6	沥青	2024
287	秣陵街道	板宁线	板霞线	宁丹线	1.737	5	水泥	6	沥青	2021
288	秣陵街道	宁中线	宁丹线	板宁线	1	4	水泥	6	沥青	2021
289	秣陵街道	汪菱线	汪塘	菱塘	2.1	4	水泥	6	沥青	2021
290	秣陵街道	干边丁家村路	干边村	丁家村	1	2.5	水泥	6	沥青	2022
291	秣陵街道	哪吒河圩堤路	宁溧路	建东机站	2.3	4	水泥	6	沥青	2024
292	秣陵街道	秣小路	秣陵初级中学	爱陵路	1	4	水泥	6	沥青	2021
293	秣陵街道	火铜线	村部	S123	4.452	5	水泥	6	沥青	2022

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
294	秣陵街道	石板线	石塘张	银杏湖大道	1.456	5	水泥	6	沥青	2022
295	秣陵街道	宁元线	宁丹线	霞辉庙桥	9.737	4	水泥	6	沥青	2023
296	秣陵街道	宁将线	S123	将军大道	5.236	6	水泥	7	沥青	2024
297	秣陵街道	新桥线	新农村	桥南村	4.705	5	水泥	6	沥青	2024
298	秣陵街道	汪元线	汪塘组	元山街	3.963	5	水泥	6	沥青	2025
299	秣陵街道	三鱼路	建东村	三鱼场	1	5	水泥	6	沥青	2025
300	秣陵街道	苗胜线	苗木基地	胜家桥村	1	5	水泥	6	沥青	2025
301	秣陵街道	吉善线	水库	官塘	1.1	5	水泥	6	沥青	2025
302	秣陵街道	吉山大道	左墅	水库	2.2	4	水泥	6	沥青	2025
303	汤山街道	朱家山至新塘	朱家山	新塘	1.2	4	水泥	5	沥青	2021
304	汤山街道	寺边至黄梅新村	寺边	黄梅新村	2.4	3.5	水泥	4	沥青	2021
305	汤山街道	龙尚湖环湖南路	龙尚湖环湖北路	龙尚湖环湖南 路	1.5	4	水泥	6	沥青	2021
306	汤山街道	石门埧路	石门埧水库	X302 县道	0.909	4	水泥	5	沥青	2022
307	汤山街道	陆神河路	陆家村	X303 陈坊出口	1	3	水泥	6	沥青	2022
308	汤山街道	花家路	花家村	花家泵站	0.6	2.5	水泥	5	沥青	2022
309	汤山街道	三府庄路	三府庄	原插花自来水 站	0.5	3	水泥	6	沥青	2022
310	汤山街道	青王路	青林社区居委会	王庄进村口	1.5	4	水泥	6	沥青	2022
311	汤山街道	上窑湾环山路	上窑湾南	汤山边界	3	4.5	水泥	6	沥青	2022
312	汤山街道	炼窑路	炼灰厂厂部	上窑湾	0.5	4	水泥	6	沥青	2022

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (km)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
313	汤山街道	大棚路	宁西西头桥	桥西村	0.8	4	水泥	6	沥青	2022
314	汤山街道	公墓路	同创路桥西路口	周良村	1.7	6	水泥	6	沥青	2022
315	汤山街道	汤水河路	中学桥	陈家边	1.1	3.5	水泥	6	沥青	2022
316	汤山街道	汤古路	汤铜路	古禄庙	0.5	3.5	水泥	6	沥青	2022
317	汤山街道	丁汤线	丁墅村	汤铜路	0.85	3.5	水泥	6	沥青	2022
318	汤山街道	螺丝冲路	螺丝冲水库后尾	老螺丝冲村	0.5	2.5	水泥	6	沥青	2022
319	汤山街道	培雪路	培墅村口	雪浪庵大桥	0.5	4	水泥	6	沥青	2022
320	汤山街道	汤外线	候寺路部队门口	沿山大道	2	5	水泥	6	沥青	2022
321	汤山街道	神孟路	孟墓村	先锋桥	0.637	6	水泥	6	沥青	2023
322	汤山街道	胡岗至黄梅新村	胡岗	黄梅新村	0.32	4	水泥	6	沥青	2023
323	汤山街道	西郭线	S122	西庄小六队	2.3	3.5	水泥	6	沥青	2023
324	汤山街道	汤丁线	S122	丁墅村	0.533	3.5	水泥	6	沥青	2023
325	汤山街道	小前村西路	X303	小前村前	0.6	4	水泥	6	沥青	2023
326	汤山街道	小伏牛路	小伏牛入村口	小伏牛	0.3	4	水泥	4	沥青	2023
327	汤山街道	张府仓路	X003	农场	0.45	5	水泥	5	沥青	2023
328	汤山街道	圩东村东道路	X303	圩东村	0.75	3.5	水泥	4	沥青	2023
329	汤山街道	顺意路	S002	X303	0.95	4	水泥	6	沥青	2023
330	汤山街道	茆家小村路	茆家桥	茆家村前桥	0.6	4	水泥	6	沥青	2023
331	汤山街道	平墓地东山头道路	平墓地路口亭子	平墓地东山头村	0.94	4	水泥	6	沥青	2023
332	汤山街道	水八仙园区道路	李孟线	李孟线	2	4	水泥	6	沥青	2023

序号	街道	线路名称	线路位置		长度 (kM)	目前技术状况		规划技术等级		改造 时间
			起点名称	终点名称		宽度 (M)	路面 类型	宽度 (M)	路面 类型	
333	汤山街道	天润路延伸	天润路	沪蓉高速	0.915	3.5	水泥	6	沥青	2024
小计					376.341					

附表 3 南京市江宁区县道网大中修工程实施序列表

街道	序号	道路名称	道路编号	行政等级	起点名称	终点名称	路线长度(km)	现状路宽(m)	现状路面	服务社区	实施年限	备注
淳化	1	青郭线	X202	县道	淳化加油站	湖熟	9.777	12	沥青	田园社区	2021	路面存在裂缝、龟网裂病害，且沿线设施、绿化缺损较多。（其中约 1 公里为园区道路）。
禄口	2	禄石线	X103	县道	与宁高线交叉	金肯学院大门	10.504	16	沥青	铜山社区		建设年代久，至今未进行大中修，路面沥青老化，存在沉陷、裂缝病害。机场南门进出要道。
秣陵	3	龙眠大道			与 S002 交叉	药科大学	5.5	16	沥青			路面裂缝、沉陷、龟网裂病害较多。
汤山	4	汤山联络线	X302	县道	与 S122 交叉	与 S002 交叉	7.486	12	沥青	汤泉社区		路面存在裂缝、龟网裂病害。
横溪	5	铜濮线	X306	县道	碾砣桥	与 S126 交叉	1.56	9	沥青	横溪社区		雨污改造后期会对道路产生一定影响。
小计							34.827					
淳化	6	黄徐线	X303	县道	咸田	与 S002 交叉	5.947	7	沥青	田园社区	2022	建设年代久，中通快递中转中心货车多。
谷里	7	定陆线	X206	县道	江宁雨花界	金牛洞桥	8.454	24	沥青	谷里社区		车流量较大，路面车辙、裂缝病害多。
麒麟	8	龙共线	X001	县道	袁家边	麒麟浦社区	6.853	7	沥青	东流社区、麒麟浦社区		车流量大，排水不良，病害多。
谷里	9	霞板线	X105	县道	牛首大道	向阳村桥	3	12	沥青	谷里社区		车流量大，货车多，路面病害显著
汤山	10	S002 上峰老线段			浦江学院大门	曹府	2.5	14	沥青	上峰社区		新线接养后老线会降为县道，目前有少量病害。
小计							26.754					

街道	序号	道路名称	道路编号	行政等级	起点名称	终点名称	路线长度(km)	现状路宽(m)	现状路面	服务社区	实施年限	备注
淳化	11	老 104 国道淳化段	X152		土桥	句容界	6.691	12	沥青	土桥社区	2023	车流量大，货车多，路面病害显著
江宁	12	孙西线	X106		江宁雨花界	官山道口	3.926	12	沥青	江宁社区		建设年代久，车流量较大。
谷里	13	板汤线	X002		江宁雨花界	周村	3.741	7	沥青	周村社区		路面存在裂缝、龟网裂病害。
湖熟、淳化	14	江汤线	X003		古秦淮河大桥	土桥	12.3	12/7	沥青	耀华社区、新跃社区、西城社区、新兴社区、土桥社区		路面存在裂缝、龟网裂病害。
小计							26.658					
汤山、淳化	15	黄徐线	X303		曹府	毛虎山庄	19.473	7	沥青	上峰社区、孟墓社区、青龙社区	2024	孟墓段雨污改造且货车多。
淳化	16	青郭线	X202		青龙山水泥厂	淳化加油站	6.36	7	沥青	青龙社区、淳化社区		路面存在裂缝、龟网裂病害。
横溪	17	宁丹线改线段			陶吴	庄头	12	12	沥青	西阳社区、陶吴社区、甘西社区、横溪社区		新线接养后老线会降为县道，目前病害多。
小计							37.833					
秣陵	18	江汤线	X003		秣陵社区医院	与 S002 交叉	5.6	7	沥青	双金社区、火炬社区	2025	雨污改造后期会对道路产生一定影响。
江宁	19	孙西线	X106		官山道口	陆郎	6.8	7	沥青	江宁社区		易损坏路段。

街道	序号	道路名称	道路编号	行政等级	起点名称	终点名称	路线长度(km)	现状路宽(m)	现状路面	服务社区	实施年限	备注
谷里、江宁	20	定陆线	X206		金牛洞桥	陆郎	11.323	7	沥青	谷里社区、张溪社区、花塘社区、陆郎社区		2020 年计划改造四处，但重载车辆多，后期病害出现会较快。
横溪	21	丹向线	X104		西迟	苏皖界	8.648	9	沥青	西岗社区、许高社区		重载车多。
谷里	22	谷三线（上行）	X304		谷里	梁家互通	4.029	12	沥青	亲见社区		下行已改造，上行病害出现较多。
淳化	23	土远线	X201		土桥	远景	9.241	9	沥青	新兴社区、远景社区		
小计							45.641					
合计							171.713					

备注：1、以上县道实施期间原则上不需要进行拓宽；2、不含开发区路段；3、后期需要根据县道网规划调整、道路车流量及建设发展情况实施调整计划。

附表 4 南京市江宁区农村旅游道路工程实施序列表

旅游环线	序号	街道	线路名称	起点	终点	线路里程 (km)	现状路宽 (m)	规划路宽 (m)	服务社区	服务年限
汤泉度假 康养环	1	汤山	X302	汤泉西路	S122	1.1	12	12	古泉	2022
	2		Y133	侯寺路	美泉路	4.9	5	7	古泉	2022
地矿奇观 探险环	3	汤山	X002	S122	S002	8.1	7	7	孟塘	2022
都市农业 示范环	4	淳化	Y287	X003	Y305	2.2	6	7	周子	2024
	5		Y305	Y287	Y290	0.5	6	7	周子	2024
	6		Y290	Y305	X201	2.5	6	7	周子	2024
	7		X201	Y290	Y283	1.6	9	9	民主	2024
	8		Y283	X201	马场山路	1.6	6	7	滨淮	2024
	9		马场山路	Y283	G104	3	7	7	滨淮	2024
江南田园文 化旅游环	10	湖熟	X303	句容河	X101	5	7	7	尚桥、周岗、龙都	2023
	11		Y1A1	X101	S243	0.3	6	7	周岗	2023
	12		CL21	X303	Y592	5.3	3.6	7	钱家渡	2023
	13		秦淮河绿道	CL21	句容河	8.9	——	7	晶明	2023
	14		句容河绿道	秦淮河	X303	7.3	——	7	双新	2023
红色记忆 寻踪环	15	横溪	Y013	X306	Y367	8.2	7	7	许呈、横山	2025
	16		Y367	Y013	街道边界	0.5	6	7	横山	2025
	17	禄口	Y367	街道边界	X306	4.7	6	7	桑园	2025
西部生态 度假环	18	横溪	Y654	G235	云台山硫铁矿	4.6	6	7	云台	2024
	19		YJA1	云台山硫铁矿	X306	2.5	6	7	云台	2024
森林氧吧 健身环	20	横溪	YJA1	X306	大岷水库	10.3	6	6	山景	2025

旅游环线	序号	街道	线路名称	起点	终点	线路里程 (km)	现状路宽 (m)	规划路宽 (m)	服务社区	服务年限
其他连接线	21	汤山	后窑路	后巷路	上窑湾	1.875	4	6	青林社区	2021
	22		关翠路	关塘	汤山翠谷南	0.567	5	6	上峰社区	2021
	23		张柏路	柏家庄	张家岗	2.196	3	4	孟塘社区	2021
	24		上窑湾北路	上窑湾北	汤山边界	1.086	4	6	青林社区	2021
	25		龙尚路延伸	龙尚路	龙尚水库	4.80	5	6	龙尚社区	2021
	26		水寺路	水西北侧	寺边村南侧	2.444	5	6	阜东社区	2021
	27		大新庄西路	大新庄西	龙王庙村	9.40	3	6	龙尚社区	2021
	28		贾家村路	五条岭	X002	2.30	4	6	余村社区	2021
	29		外圩东路	外圩东	龙王庙	7.955	4	4	龙尚、古泉	2021

附表5 南京市江宁区县道危桥改造工程实施序列表

序号	街道	路线	桥梁名称	桥梁长度 (m)	桥面宽度 (m)	服务社区	实施年份	改建跨径(m)	改建桥宽(m)
1	麒麟街道	X001 龙共线	西流桥	44	8.5	东流社区	2021	3*13	9
2			东流桥	24	8		2021	1*16	9
3			K3 涵洞	5	6		2021	1*10	9
4			K3+300 涵洞	5	6		2021	1*10	9
5			K5+100 涵洞（马家桥）	5	6		2021	1*10	9
6	湖熟街道	X003 江汤线	耀华桥	29	8	耀华社区	2021	1*25	9
7			北涵桥	40	8	丹桂社区	2022	3*10	9
8			三界桥	13	8		2022	1*13	9
9		X101 湖周线	K4+700 盖板涵	5	6	周岗社区	2021	1*10	9
10		X303 黄徐线	双市桥	85	12	周岗社区	2022	5*16	12
11	淳化街道	X003 江汤线	西湖闸桥	15.5	7	西埠社区	2021	1*10	9
12			西湖桥	18	8		2021	1*13	9
13			北街桥	69	8	土桥社区	2021	4*16	9
14	秣陵街道	X003 江汤线	正方东路桥	78	27.2	秣陵社区	2021	3*25	28
15			友谊大桥（溧水河大桥）	125	8	火炬社区	2021	30+45+30	9
16	横溪街道	X104 丹向线	西岗桥	22	12	西岗社区	2021	1*13	12
17			许高小桥	25.3	12	许高社区	2021	1*13	12
18			乔木山桥	23	12		2021	1*20	12
19			长山小桥	20	12		2021	1*10	12

序号	街道	路线	桥梁名称	桥梁长度 (m)	桥面宽度 (m)	服务社区	实施年份	改建跨径(m)	改建桥宽 (m)
20	禄口街道	X103 禄石线	新溧塘桥	18	11	铜山社区	2022	1*13	12

附表 6 南京市江宁区乡村道危桥改造工程实施序列表

序号	街道名称	线路名称	桥梁名称	原桥梁长度 (m)	原桥面宽度 (m)	服务社区	实施年份	改建跨径 (m)	改建桥宽 (m)
1	东山街道	上高路	高桥	12	7	高桥社区	2021	1*13	9
2		中心河堤	薛家桥	50	5	泥塘社区	2021	3*20	9
3		农花路通秦淮路	曹城桥	20	6	龙西社区	2021	1*20	9
4	淳化街道	土桥社区九队村路	九队桥	6	4	土桥	2021	1*10	9
5		万石线	石秋桥	20	6	周子	2021	1*20	9
6		土王线	孙庄桥	20	6		2021	1*20	9
7		水达线	达里岗桥	130	5		2021	20+30+35+30+20	12
8		远土线	周子桥	80	12		2021	3*30	12
9		郭尧线	郭村桥	30	4	新林	2022	3*10	9
10		连接土王线和水土线	高家桥	96	6	西埠、周子	2022	5*20	9
11		胜咸路	咸家边桥	35	3.5	新华	2022	3*13	9
12		胜咸路	新华桥	34	3.2		2022	3*13	9
13		胜咸路	坟山桥	32	3.3		2022	3*10	9
14	汤山街道	东五线	马三小桥	6	3.5	阜东	2021	1*10	9
15		东寺线	水西西涵小桥	8	3.5		2021	1*10	9
16		汤高线	上高埧桥	18	2	高庄	2021	1*20	9
17		李孟线	东边桥	11.7	10.2	鹤龄	2021	1*13	12
18		梅家边村内道路	前头桥	5	3.5	作厂	2021	1*10	9

序号	街道名称	线路名称	桥梁名称	原桥梁长度 (m)	原桥面宽度 (m)	服务社区	实施年份	改建跨径 (m)	改建桥宽 (m)
19		梅家边村内道路	后径桥	8	4	上峰	2021	1*10	9
20		王盖村村内道路	拦泥坝桥	15	2		2022	1*16	9
21		李岗头村村内道路	和尚坝桥	7	2		2022	1*10	9
22		关塘堰村村内道路	圩西桥	12	3		2022	1*13	9
23		张府仓村村内道路	下坝桥	10	3		2022	1*13	9
24		案子桥村内道路	六真塘南桥	18	2.6	建设	2022	1*20	9
25	麒麟街道	仓小线	闸桥	20	10	泉水社区	2021	1*20	12
26	湖熟街道	竹西路	毛家沼桥	16	6	和平	2021	1*16	9
27		竹西路	直沟桥	18	6		2021	1*20	9
28		友曹路	友谊天桥	12	8	和进	2021	1*13	9
29		湖新路	马塘桥	10	6	耀华	2022	1*13	9
30		湖友线	友谊桥	10	6	和进	2022	1*13	9
31	秣陵街道	宁将线	鬼子桥	43	6.3	凤凰社区	2021	13+16+13	9
32		司新线	三板桥	8.4	6	周里社区	2021	1*10	9
33		湖高线	徐家桥	11	3.7	东旺社区	2021	1*13	9
34		史胜线	石家坝二桥	15	3	胜家桥社区	2021	1*16	9
35		宁将线	凤凰山一桥	18.9	7.4	西旺社区	2021	1*20	9
36		司新线	南旺圩桥	16.5	6		2021	1*16	9
37		村庄内部道路	阔塘桥	4	3.5	元山社区	2022	1*10	9
38		村庄内部道路	大正塘桥	3.5	3.5		2022	1*10	9
39		机耕路	小夏桥	3.5	3.5		2022	1*10	9
40		机耕路	西林水库桥	3.5	3.5		2022	1*10	9

序号	街道名称	线路名称	桥梁名称	原桥梁长度 (m)	原桥面宽度 (m)	服务社区	实施年份	改建跨径 (m)	改建桥宽 (m)
41		双石路	新塘桥	4	3.5		2022	1*10	9
42		花园路	花园桥	3	4		2022	1*10	9
43	谷里街道	赵府	赵府桥	8.5	3.5	柏树社区	2021	1*10	9
44		双石路	新塘桥	7	4	双塘社区	2021	1*10	9
45		王荆线	西塘三前桥	6	3	箭塘社区	2021	1*10	9
46		王荆线	西塘一前桥	6	3	箭塘社区	2022	1*10	9
47		大荆线	万子埂桥	10	6	荆刘社区	2022	1*10	9
48		板汤线	九家塘桥	10	6	周村	2022	1*13	9
49		板汤线到王家槽坊	周塘桥	10	6		2022	1*13	9
50		管村-中庄邵家	管村村口桥	15.7	8.2	清修	2021	1*16	9
51	江宁街道	江上线	杭家桥	14	4	上湖	2021	1*16	9
52		江上线	土桥头桥	7	5		2021	1*10	9
53		宁汤线	王小桥	4	3		2021	1*10	9
54		天鹅至青年	王家坝桥	19.5	4.5	荷花	2021	1*20	9
55		李大至柳山	汪塘桥	12	4	洪幕	2021	1*13	9
56		嵇村至戴村	戴村桥	8	4	洪幕	2022	1*10	9
57		李大至柳山	吴坝桥	10	4		2022	1*13	9
58		大牛落	大兴桥	12	3	大庙	2022	1*13	9
59		张家	张家桥	8	3		2022	1*10	9
60		桐山线	桐塘桥	10	4	西宁村	2022	1*13	9
61		吴家	吴家大塘桥	6	3		2022	1*10	9

序号	街道名称	线路名称	桥梁名称	原桥梁长度 (m)	原桥面宽度 (m)	服务社区	实施年份	改建跨径 (m)	改建桥宽 (m)
62		祠堂	大平塘桥	6	3		2022	1*10	9
63	横溪街道	大塘路	大塘桥	8	4	丹阳	2021	1*10	9
64		双张线	张家桥	13	4	西岗	2021	1*13	9
65		白赵线	赵村桥	12	4	许呈	2021	1*13	9
66		大高线	长塘桥	8	5	许高	2021	1*10	9
67		横铜路	杨家村桥	12	4	横山	2021	1*13	9
68		许上线	上盖桥	14	5	许高	2021	1*16	9
69		宁七线	七仙桥	23	4	勇跃	2021	1*20	9
70		张高线	高台桥	8	4	许高	2022	1*10	9
71		张畔路	渡戴桥	8	4		2022	1*10	9
72		江龙线	端家桥	11	5	红旗	2022	1*13	9
73		王龙线	黄泥坝桥	6	5	西阳	2022	1*10	9
74		王龙线	工农桥	8	5		2022	1*10	9
75		乌邓路	邓村桥	8	4	横山	2022	1*10	9
76	禄口街道	东西线	李家桥	6	5	张桥社区	2022	1*10	9
77		东西线	白庄桥	6	5		2022	1*10	9
